
GRX
DESMANTELAMIENTO DE SISTEMAS EXISTENTES

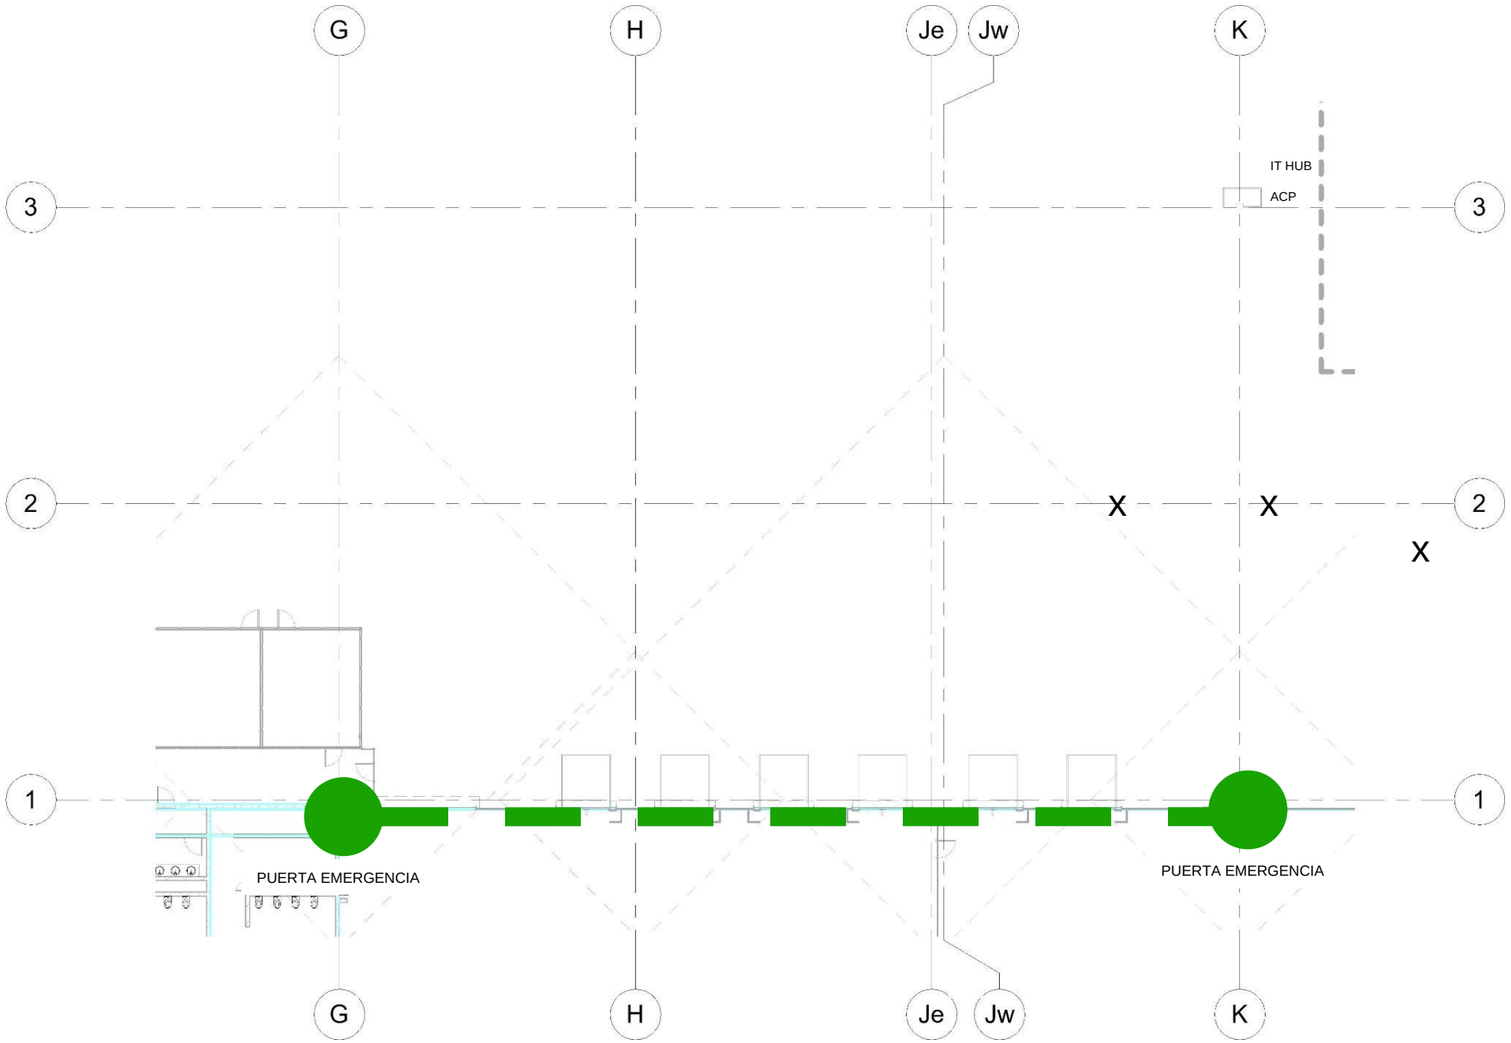

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO							
				RECOVERY			
# SEQ	TASK	START	FINISH	START	FINISH	%	CONSTRAINS
1	Identificación de cableado de dispositivos de control de acceso. Desde la columna K1 hacia la columna G1. Desconexión de dispositivos de control de accesos de las puertas de emergencia ubicadas en las columnas K1 y G1.	24/03/2026	24/03/2026			100%	Complete

Dispositivos

Retiro de soportes y tubería


Retiro de cableado

SYMBOLOGY FOR SCHEDULE

- COMPLETE
- IN PROGRESS
- ON HOLD
- CONSTRAIN

UPDATED: OCTUBRE | 13 | 2026
SUPERVISOR: LUIS APARICIO / HÉCTOR MUÑIZ

GRX
DESMANTELAMIENTO DE SISTEMAS EXISTENTES

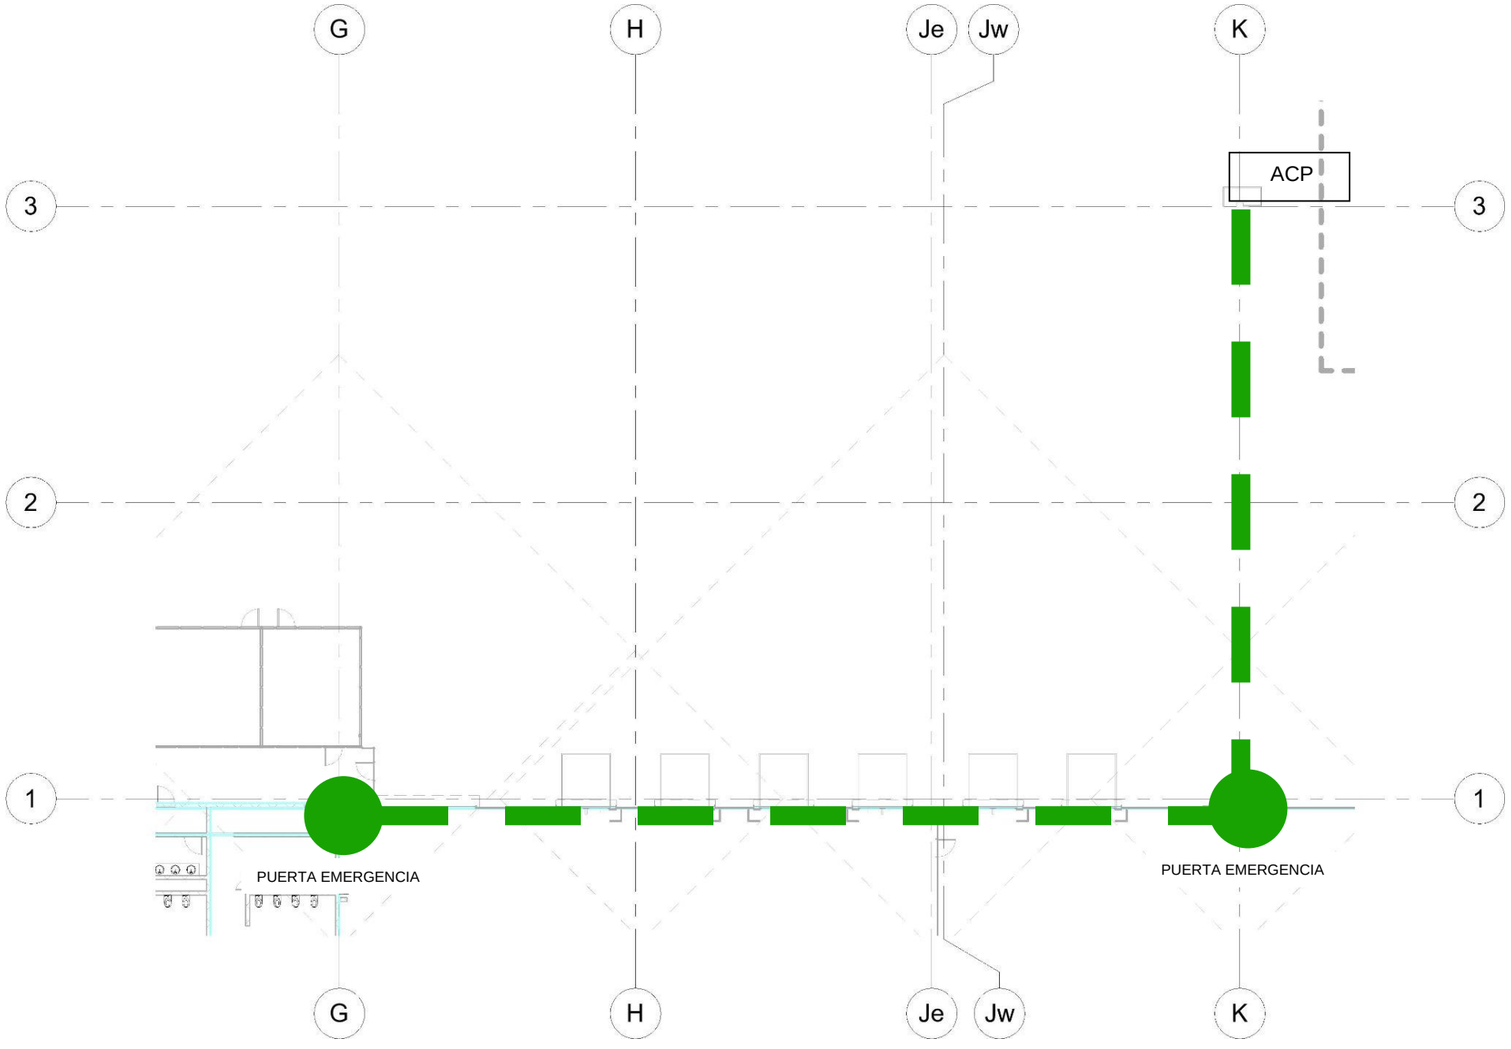

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO							
				RECOVERY			
# SEQ	TASK	START	FINISH	START	FINISH	%	CONSTRAINS
2	Retiro de cableado de los dispositivos del sistema de control de acceso. Desde la columna K1 hacia la columna G1. Retiro de cableado de los dispositivos del sistema de control de acceso. Desde la columna K1 hacia la columna K3.	25/03/2026	25/03/2026			100%	Complete


Retiro de cableado

SYMBOLOGY FOR SCHEDULE

- COMPLETE
- IN PROGRESS
- ON HOLD
- CONSTRAIN

UPDATED:OCTUBRE | 13 | 2026
SUPERVISOR: LUIS APARICIO / HÉCTOR MUÑIZ

GRX
DESMANTELAMIENTO DE SISTEMAS EXISTENTES

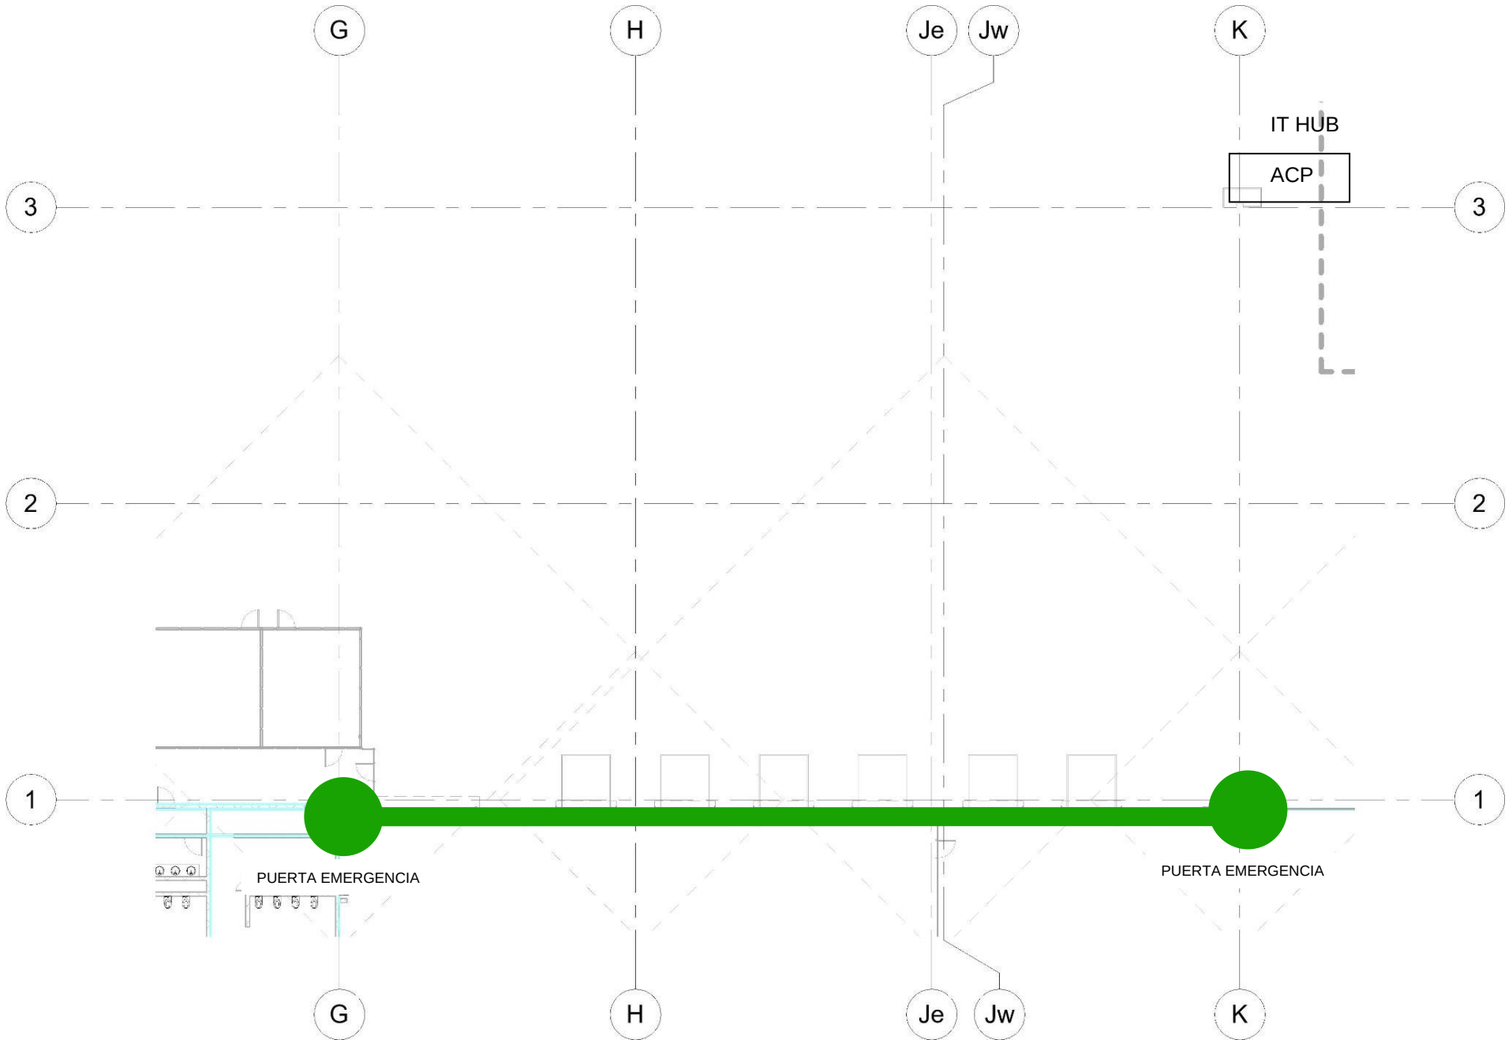

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO							
				RECOVERY			
# SEQ	TASK	START	FINISH	START	FINISH	%	CONSTRAINS
3	Retiro de soportes y tubería Conduit de los dispositivos del sistema de control de acceso. Desde la columna K1 hacia la columna G1.	26/03/2026	26/03/2026			100%	Complete


Retiro de soportes y tubería

SYMBOLOGY FOR SCHEDULE

- COMPLETE
- IN PROGRESS
- ON HOLD
- CONSTRAIN

UPDATED: OCTUBRE | 13 | 2026
SUPERVISOR: LUIS APARICIO / HÉCTOR MUÑIZ

GRX
DESMANTELAMIENTO DE SISTEMAS EXISTENTES

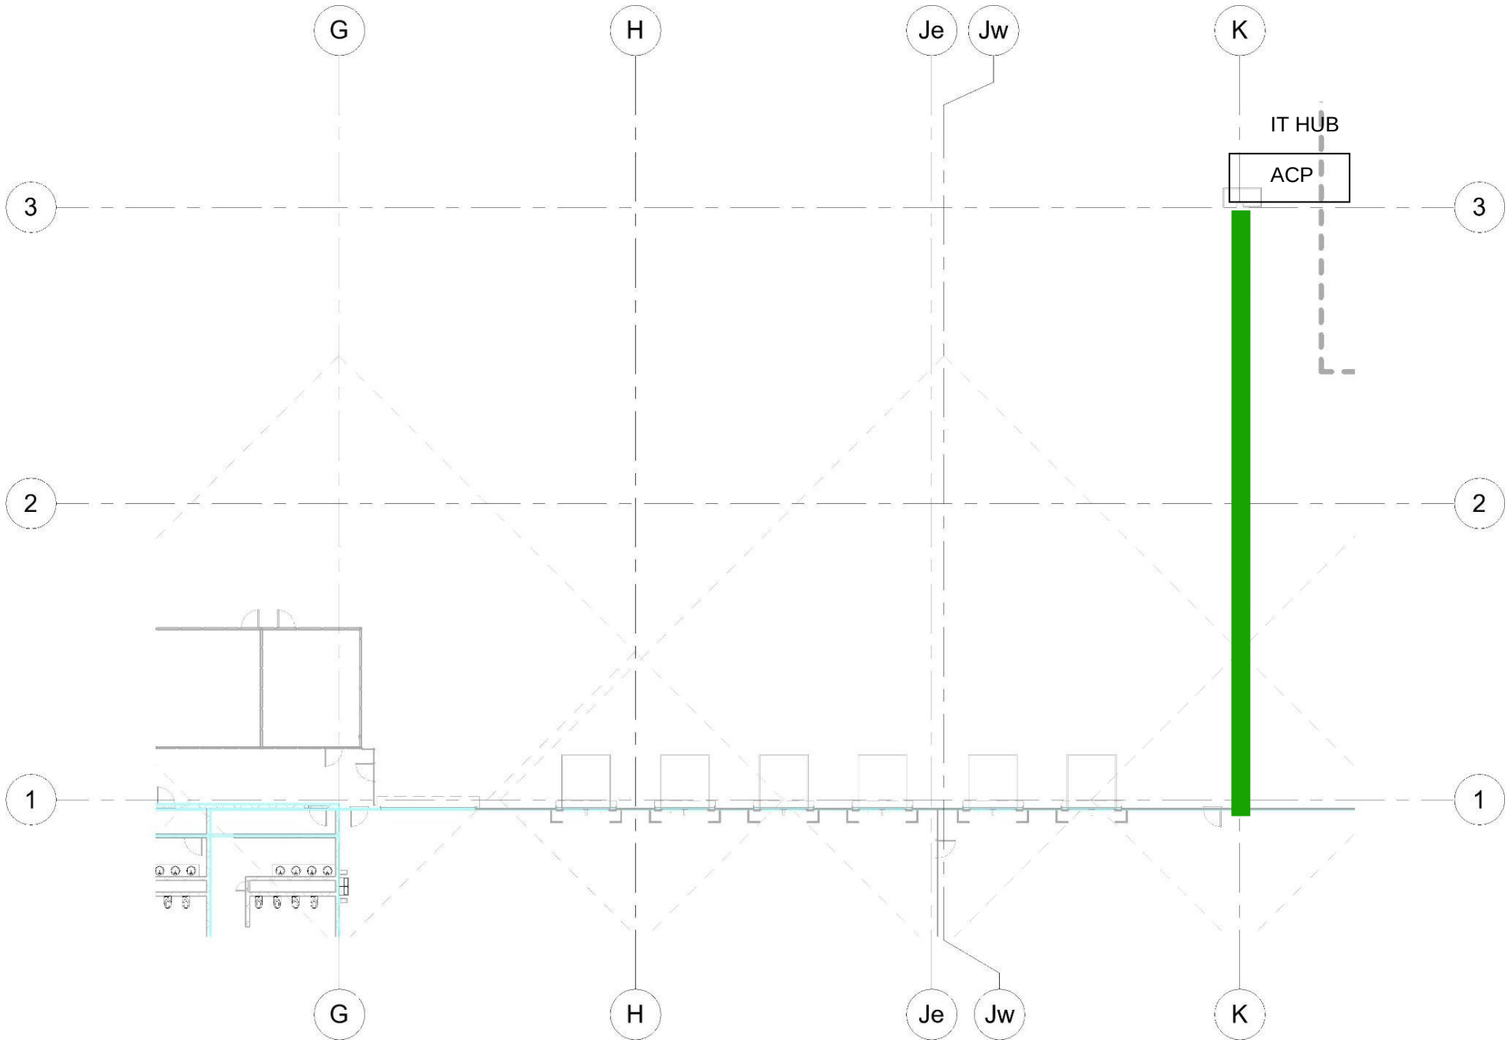

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO							
				RECOVERY			
# SEQ	TASK	START	FINISH	START	FINISH	%	CONSTRAINS
4	Retiro de soportes y tubería Conduit de los dispositivos del sistema de control de acceso. Desde la columna K1 hacia la columna K3.	27/03/2026	27/03/2026			100%	Complete


Retiro de soportes y tubería

SYMBOLOGY FOR SCHEDULE

- COMPLETE
- IN PROGRESS
- ON HOLD
- CONSTRAIN

UPDATED: OCTUBRE | 13| 2026
SUPERVISOR: LUIS APARICIO / HÉCTOR MUÑIZ

GRX
DESMANTELAMIENTO DE SISTEMAS EXISTENTES

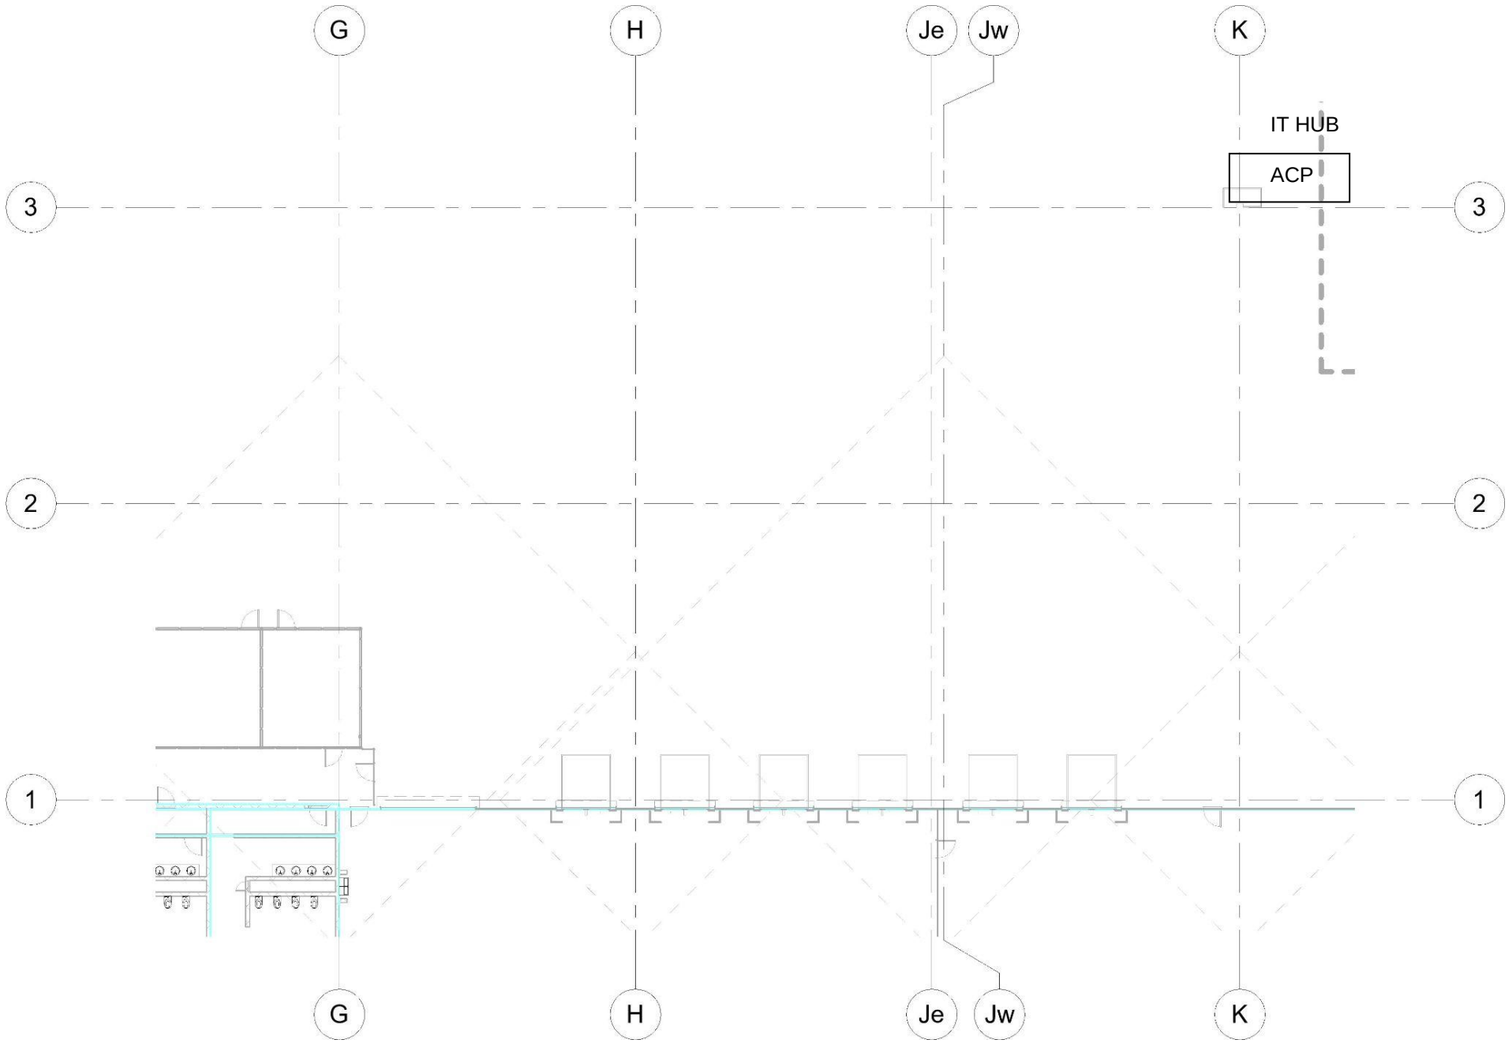

SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA							
# SEQ	TASK	START	FINISH	RECOVERY START	RECOVERY FINISH	%	CONSTRAINS
5	Retiro de gabinete de ACP ubicado en It Hub columna K-3 Mezzanine Sin afectar el paso del montacargas	26/03/2026	26/03/2026			0%	

Retiro de soportes y tubería


Gabinete Himel

SYMBOLOGY FOR SCHEDULE

- COMPLETE
- IN PROGRESS
- ON HOLD
- CONSTRAIN

UPDATED:OCTUBRE | 13 | 2026
SUPERVISOR: LUIS APARICIO / HÉCTOR MUÑIZ

GRX
DESMANTELAMIENTO DE SISTEMAS EXISTENTES

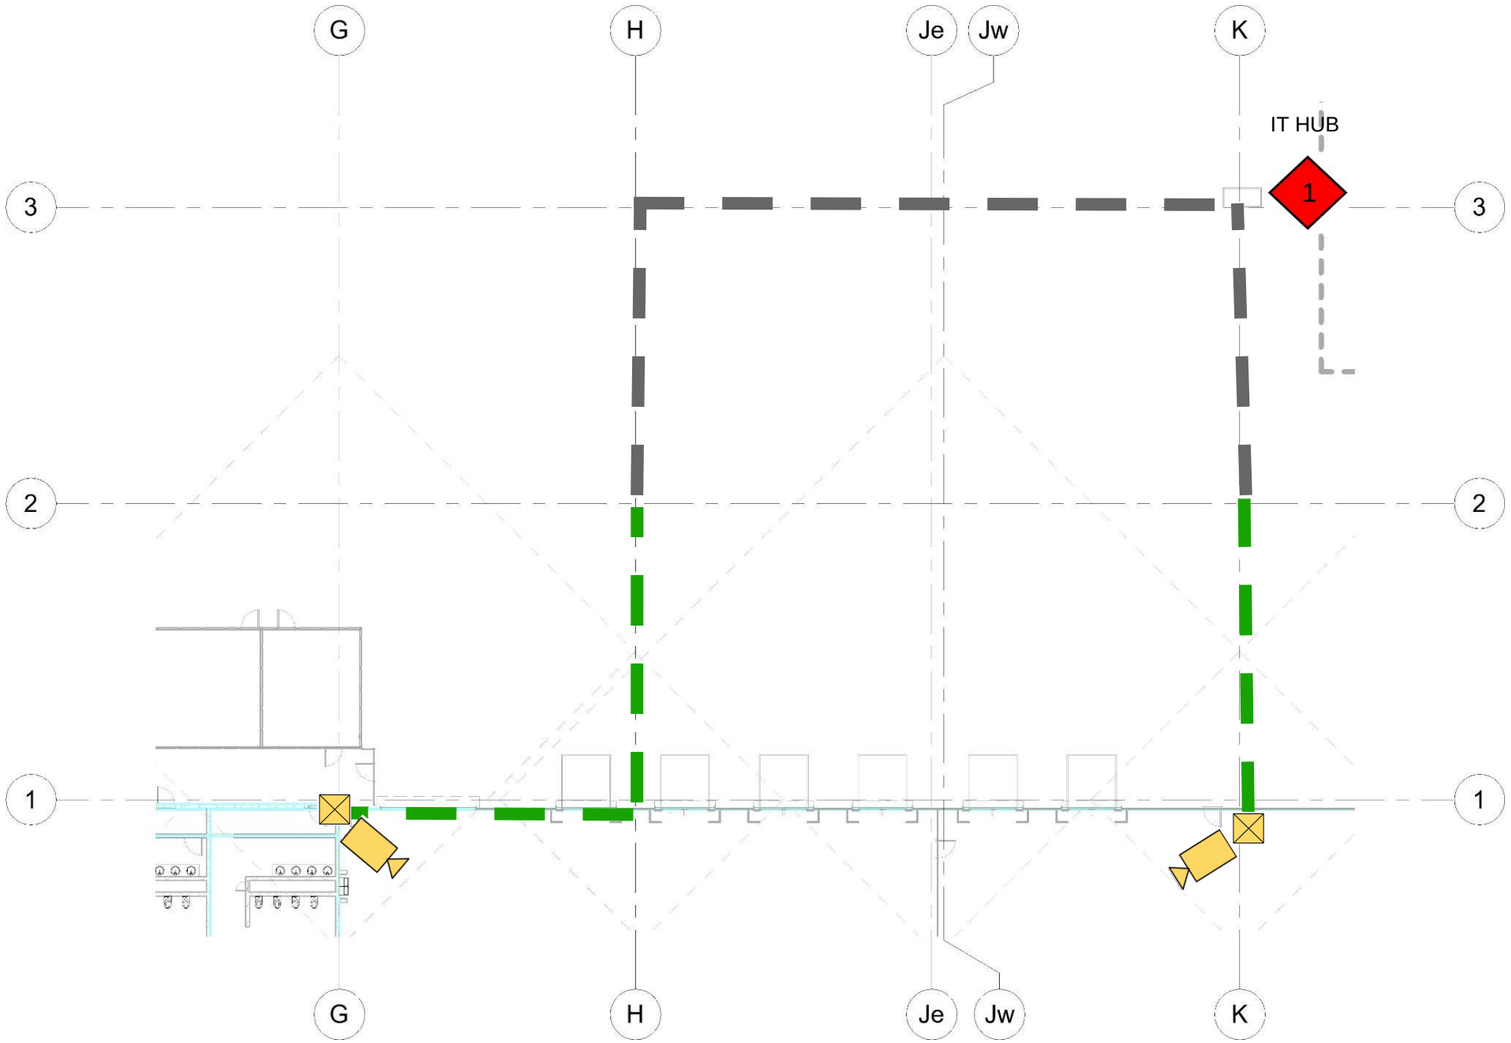

SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA							
# SEQ	TASK	START	FINISH	RECOVERY START	RECOVERY FINISH	%	CONSTRAINS
6	Retiro de cableado y gabinetes himel, de las cámaras de CCTV de las columnas G1 y K1 hasta K3.	29/03/2026	29/03/2026			90%	1

RESTRICCIÓN	
N.	DESCRIPCIÓN
1	Desconexión de cables UTP en panel de parcheo (otros)

Retiro de soportes y tubería

Retiro de cableado UTP

Gabinete Himel


Camara video vigilancia

SYMBOLOGY FOR SCHEDULE

- COMPLETE
- IN PROGRESS
- ON HOLD
- CONSTRAIN

UPDATED: OCTUBRE | 13 | 2026
SUPERVISOR: LUIS APARICIO / HÉCTOR MUÑIZ

GRX
DESMANTELAMIENTO DE SISTEMAS EXISTENTES

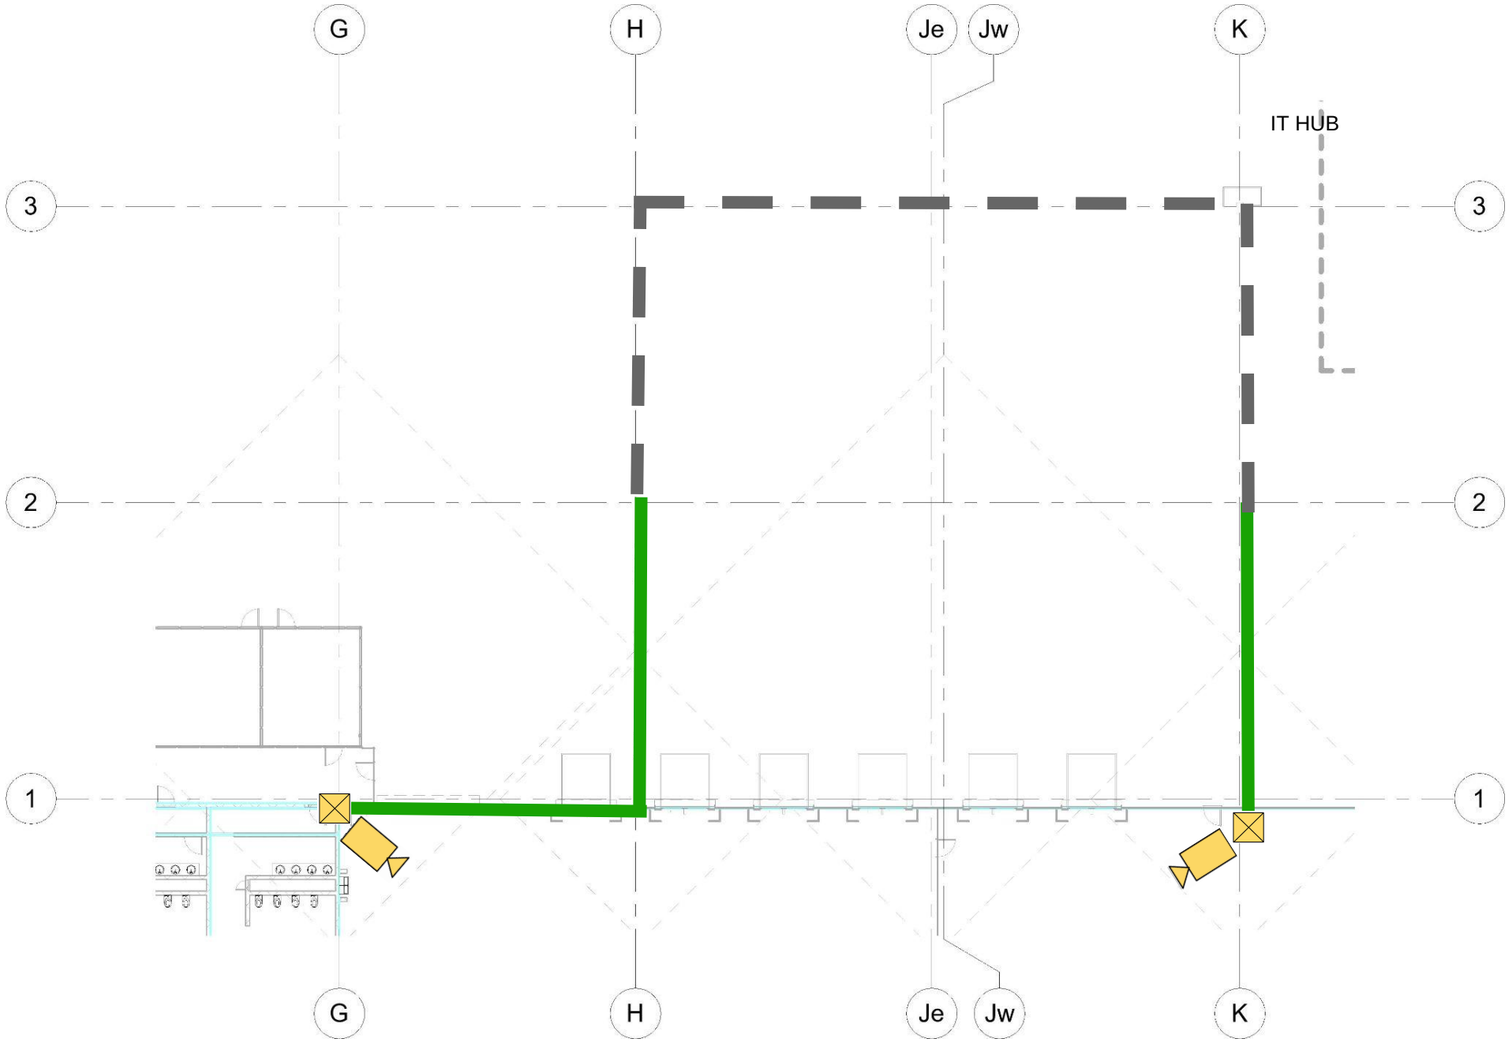

SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA							
# SEQ	TASK	START	FINISH	RECOVERY START	RECOVERY FINISH	%	CONSTRAINS
7	Retiro de soportes y tubería Conduit de las cámaras del sistema de cctv que se ubican en la columna K1 hacia la G1. Retiro de soportes y tubería Conduit de las cámaras del sistema de cctv que se ubican en la columna K1 hacia la K3.	30/03/2026	30/03/2026			100%	COMPLETE

Retiro de soportes y tubería


Gabinete Himel

SYMBOLOGY FOR SCHEDULE

- COMPLETE
- IN PROGRESS
- ON HOLD
- CONSTRAIN

UPDATED: OCTUBRE | 13 | 2026
SUPERVISOR: LUIS APARICIO / HÉCTOR MUÑIZ

GRX
VIDEOVIGILANCIA (ÁREA M,N) FASE 1

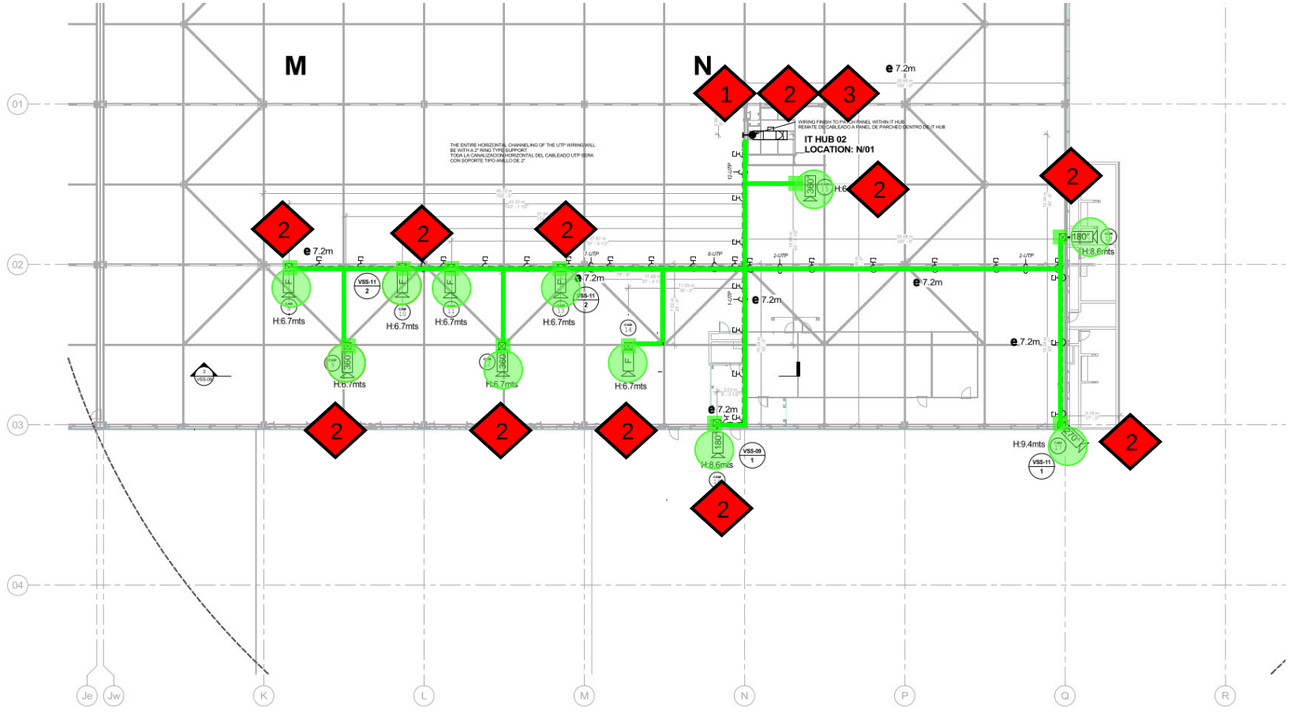

# SEQ	TASK	START	FINISH	RECOVERY START	RECOVERY FINISH	RECOVERY 02 START	RECOVERY 02 FINISH	%	CONSTRAINS
1	Instalación de soportes para cableado UTP	09/03/2026	20/03/2026					100%	COMPLETE
2	Instalación de Cableado UTP Cat 6A en área M,N.	01/04/2026	01/04/2026	11/05/2026	13/05/2026	22/06/2026	24/06/2026	100%	COMPLETE
3	Instalación de cajas NEMA para las cámaras de video-vigilancia	13/04/2026	17/04/2026	06/05/2026	7/05/2026	21/06/2026	26/06/2026	100%	COMPLETE
4	Canalización para bajada conduit, para las cámaras en área M,N.	15/05/2026	22/05/2026					100%	COMPLETE
5	Instalación de cámaras de video-vigilancia área M,N.	01/06/2026	05/06/2026	12/06/2026	22/06/2026	28/06/2026	03/07/2026	100%	COMPLETE
6	Desmantelar cableado de la columna Q03-Q02 y Q00-N01	04/05/2026	04/05/2026					100%	COMPLETE

PUNCH LIST		DATE		%
N.	DESCRIPCIÓN	START	FINISH	
1	Falta Etiqueta en Caja	20/07/2026	20/07/2026	100 %
2	Faltan etiquetas en utp y face plate	14/08/2026	14/08/2026	100%
3	Peinar nodo de datos (CAM8)	28/07/2026	01/08/2026	100%

SYMBOLOGY FOR SCHEDULE

- COMPLETE
- IN PROGRESS
- ON HOLD
- CONSTRAIN


SIMBOLOGÍA

- SOPORTERIA
- CABLEADO
- CÁMARA

1. Se necesita la instalación del IT-HUB por GM-IT para finalizar actividades.
2. Se necesita las direcciones IP y la asignación de puertos en los IT-HUB por GM-IT
3. Se necesita por parte de GM-IT, definir la ubicación en el rack y la dirección IP para el NVR.

UPDATED: OCTUBRE | 13 | 2026
SUPERVISOR: LUIS APARICIO / HÉCTOR MUÑIZ

GRX
VIDEOVIGILANCIA (ÁREA L) FASE 2

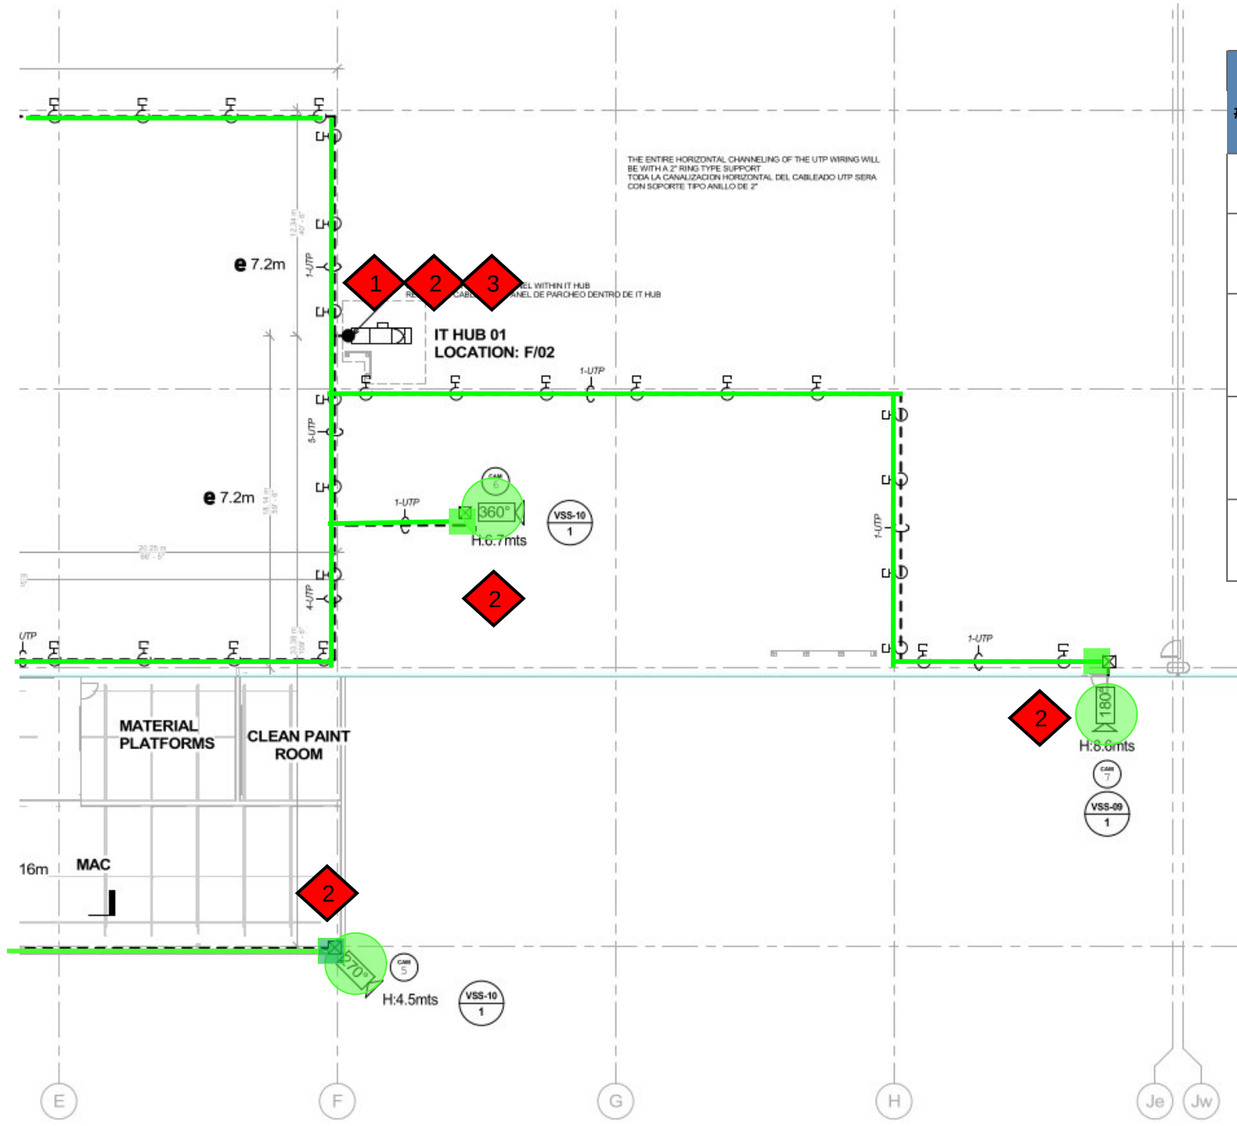

# SEQ	TASK	START	FINISH	RECOVERY		RECOVERY 02		%	CONSTRAINS
				START	FINISH	START	FINISH		
1	Instalación de soportes para cableado UTP	13/04/2026	16/04/2026	22/05/2026	15/06/2026			100%	COMPLETE
2	Instalación de Cableado UTP Cat 6A en área L	11/05/2026	19/05/2026	29/05/2026	15/06/2026			100%	COMPLETE
3	Instalación de cajas NEMA para las cámaras de video-vigilancia	06/05/2026	9/05/2026	02/06/2026	05/06/2026			100%	COMPLETE
4	Canalización para bajada conduit, para las cámaras en área L Fase 2	26/05/2026	26/05/2026	05/06/2026	08/06/2026			100%	COMPLETE
5	Instalación de cámaras de video-vigilancia área L Fase 2,Fase2	6/06/2026	10/06/2026	14/06/2026	23/06/2026	14/8/2026	14/08/2026	100%	COMPLETE

PUNCH LIST		DATE		
N.	DESCRIPCIÓN	START	FINISH	%
1	Falta Etiqueta en Caja	20/07/2026	20/07/2026	100 %
2	Faltan etiquetas en utp y face plate	14/08/2026	14/08/2026	100%
3	Colocar sello y recortar esparrago (CAM5)	28/07/2026	01/08/2026	100%

1. Se necesita la instalación del IT-HUB por GM-IT para finalizar actividades.
2. Se necesita las direcciones IP y la asignación de puertos en los IT-HUB por GM-IT
3. Se necesita por parte de GM-IT, definir la ubicación en el rack y la dirección IP para el NVR.

SIMBOLOGÍA


- SOPORTERIA
- CABLEADO
- CÁMARA

SYMBOLOGY FOR SCHEDULE

- COMPLETE
- IN PROGRESS
- ON HOLD
- CONSTRAIN

UPDATED: OCTUBRE | 13 | 2026
SUPERVISOR: LUIS APARICIO / HÉCTOR MUÑIZ

GRX
VIDEOVIGILANCIA (ÁREA L) FASE 3

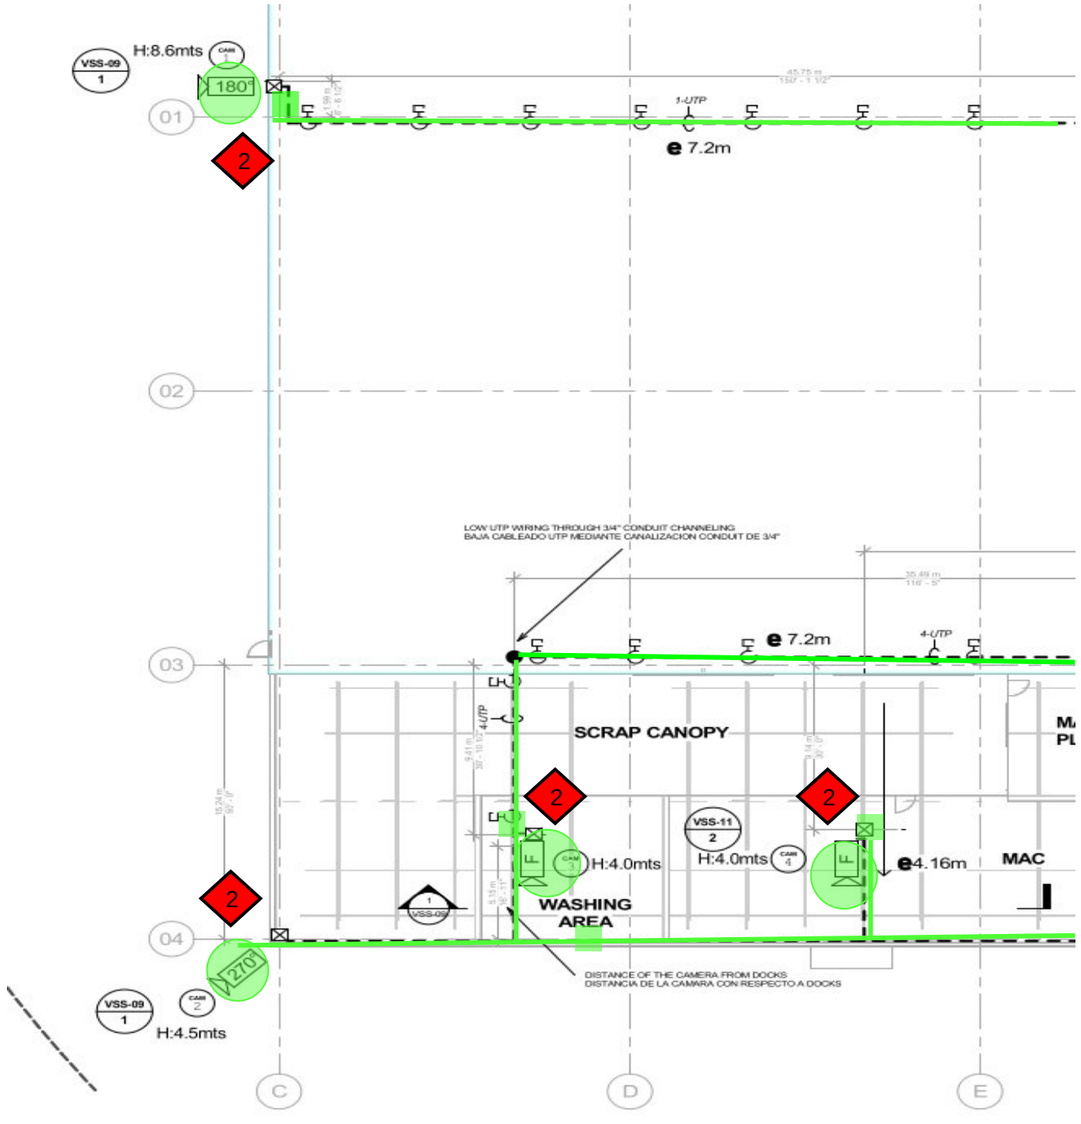

# SEQ	TASK	START	FINISH	RECOVERY START	RECOVERY FINISH	RECOVERY 02 START	RECOVERY 02 FINISH	%	CONSTRAINS
1	Instalación de soportes para cableado UTP	01/06/2026	03/06/2026	01/06/2026	15/06/2026			100%	COMPLETE
2	Instalación de Cableado UTP Cat 6A en área L	04/06/2026	05/06/2026	04/06/2026	15/06/2026			100%	COMPLETE
3	Instalación de cajas NEMA para las cámaras de video-vigilancia	05/06/2026	08/06/2026					100%	COMPLETE
4	Canalización para bajada conduit, para las cámaras en área L Fase 3	08/06/2026	10/06/2026					100%	COMPLETE
5	Instalación de cámaras de video-vigilancia en área L Fase 3	11/06/2026	13/06/2026	15/06/2026	22/06/2026	03/07/2026	06/07/2026	100%	COMPLETE

PUNCH LIST		DATE		
N.	DESCRIPCIÓN	START	FINISH	%
1	Falta Etiqueta en Caja.	20/07/2026	20/07/2026	100%
2	Faltan etiquetas en utp y fase plate	14/08/2026	14/08/2026	100%
3	Falta marcar torque (CAM3)	28/07/2026	01/08/2026	100%
4	Falta sello en esparragos (CAM2)	28/07/2026	01/08/2026	100%
5	Retirar cinta (E03)	28/07/2026	01/08/2026	100%
6	Peinar nodos de datos (E/03-04) y (C-D/04)	28/07/2026	01/08/2026	100%

SIMBOLOGÍA

- SOPORTERIA
- CABLEADO
- CÁMARA


SYMBOLOGY FOR SCHEDULE

- COMPLETE
- IN PROGRESS
- ON HOLD
- CONSTRAIN

1. Se necesita la instalación del IT-HUB por GM-IT para finalizar actividades.
2. Se necesita las direcciones IP y la asignación de puertos en los IT-HUB por GM-IT
3. Se necesita por parte de GM-IT, definir la ubicación en el rack y la dirección IP para el NVR.

UPDATED: OCTUBRE | 13 | 2026
SUPERVISOR: LUIS APARICIO / HÉCTOR MUÑIZ

GRX
VIDEOVIGILANCIA CAM-19

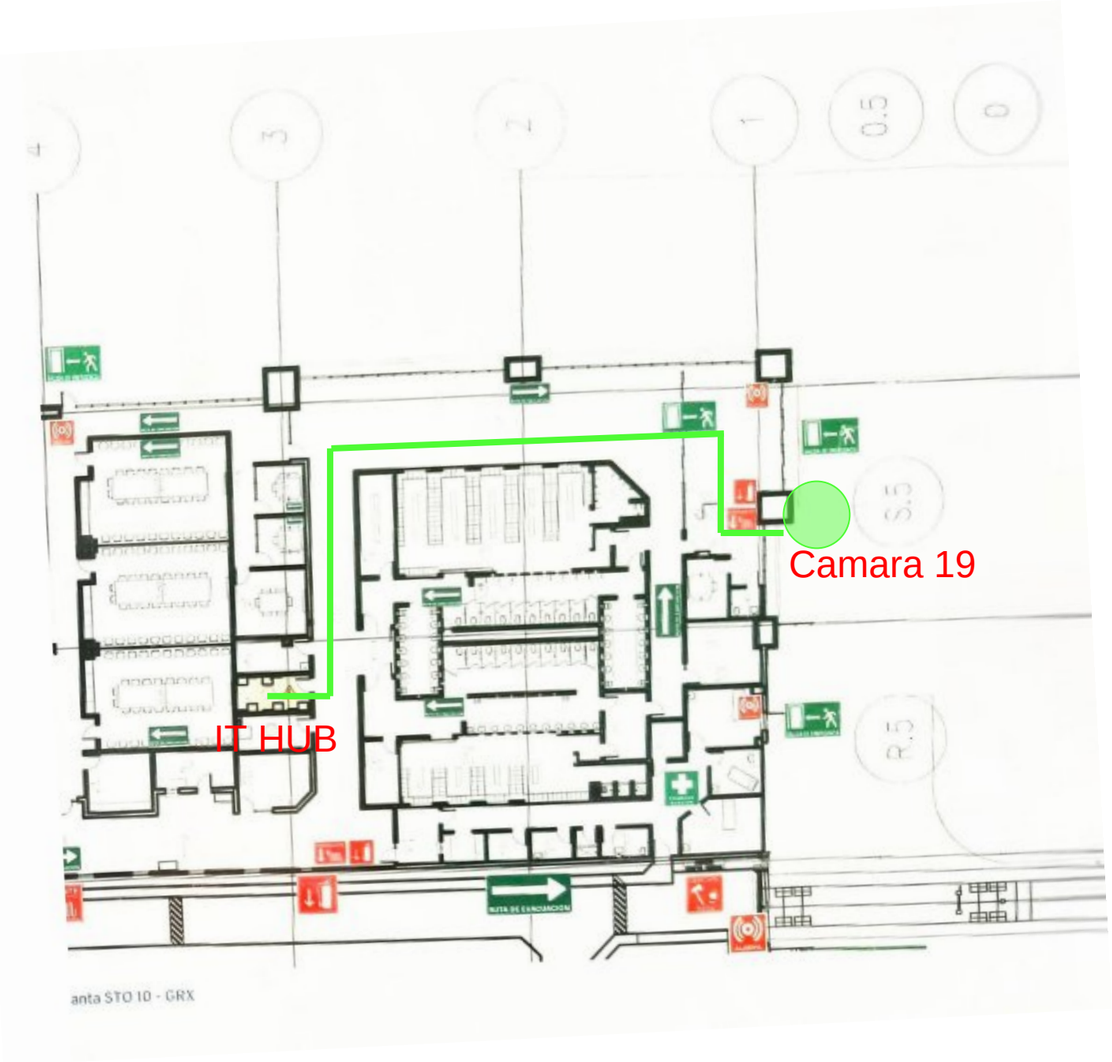

# SEQ	TASK	START	FINISH	RECOVERY		%	CONSTRAINS
				START	FINISH		
1	Instalación de Tuberia para cableado UTP (CAM19)	04/06/2026	06/06/2026	21/06/2026	28/06/2026	100%	COMPLETE
2	Instalación de Cableado UTP Cat 6A en área LOBY PASILLO GRX	06/06/2026	09/06/2026	05/07/2026	05/07/2026	100%	COMPLETE
3	Instalación de caja NEMA para las cámaras de video-vigilancia (CAM19)	09/06/2026	10/06/2026	12/07/2026	12/07/2026	100%	COMPLETE
4	Instalación de cámaras de video-vigilancia (CAM19)	18/06/2026	18/06/2026	19/07/2026	19/07/2026	100%	COMPLETE

PUNCH LIST		DATE		
N.	DESCRIPCIÓN	START	FINISH	%
1	Pendiente de rematar Cableado (IT HUB)	14/08/2026	14/08/2026	100%
2	Falta Etiqueta en Caja y Cableado Utp (Falta Matriz)	14/08/2026	14/08/2026	100%
3	Falta colocar etiqueta y peinar nodo (CAM9)	28/07/2026	01/08/2026	100%

SIMBOLOGÍA

SOPORTERIA

CABLEADO

CÁMARA

SYMBOLOGY FOR SCHEDULE

COMPLETE


IN PROGRESS


ON HOLD

CONSTRAIN

UPDATED: OCTUBRE | 13 | 2026
SUPERVISOR: LUIS APARICIO / HÉCTOR MUÑIZ

GRX
VIDEOVIGILANCIA (ÁREA R,S,T)

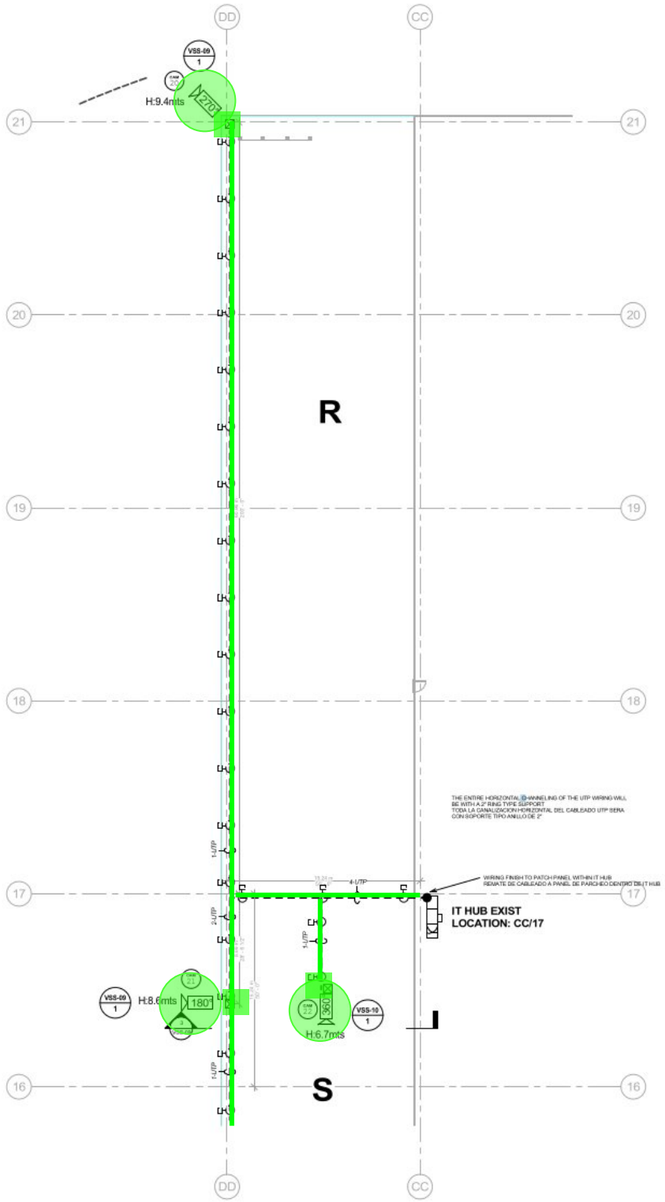

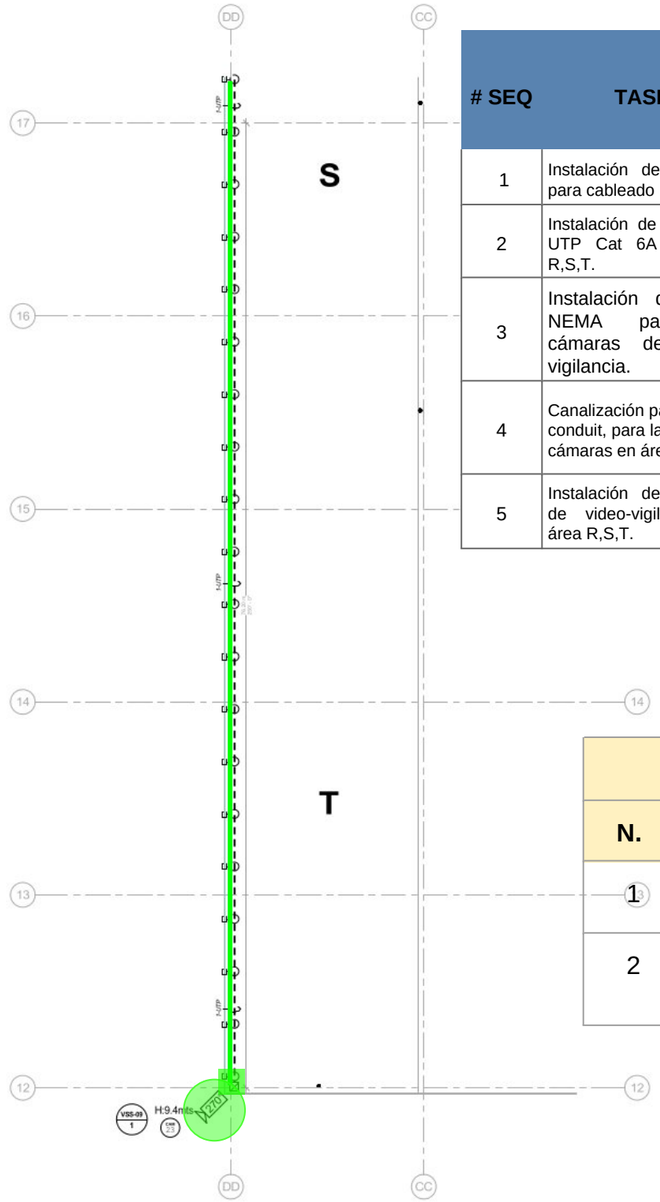

# SEQ	TASK	START	FINISH	RECOVERY START	RECOVERY FINISH	RECOVERY 02 START	RECOVERY 02 FINISH	%	CONSTRAINS
1	Instalación de soportes para cableado UTP	30/03/2026	01/04/2026	05/05/2026	07/05/2026			100%	COMPLETE
2	Instalación de Cableado UTP Cat 6A en área R,S,T.	19/05/2026	22/05/2026	23/05/2026	27/05/2026			100%	COMPLETE
3	Instalación de cajas NEMA para las cámaras de video-vigilancia.	05/05/2026	07/05/2026	27/05/2026	30/05/2026			100%	COMPLETE
4	Canalización para bajada conduit, para las cámaras en área R,S,T.	29/05/2026	31/05/2026	27/05/2026	31/05/2026			100%	COMPLETE
5	Instalación de cámaras de video-vigilancia en área R,S,T.	20/05/2026	21/05/2026	12/06/2026	15/06/2026	28/06/2026	30/06/2026	100%	COMPLETE

PUNCH LIST		DATE		%
N.	DESCRIPCIÓN	START	FINISH	
1	Falta Etiqueta en Caja	20/07/2026	22/07/2026	100%
2	Falta colocación de etiquetas en cable y fase plate	14/08/2026	14/08/2026	100%

SYMBOLOGY FOR SCHEDULE


- COMPLETE
- IN PROGRESS
- ON HOLD
- CONSTRAIN

SIMBOLOGÍA

- SOPORTERIA
- CABLEADO
- CÁMARA

UPDATED: OCTUBRE | 13 | 2026
SUPERVISOR: LUIS APARICIO / HÉCTOR MUÑIZ

GRX
COMUNICACIONES EN ÁREA FASE 1

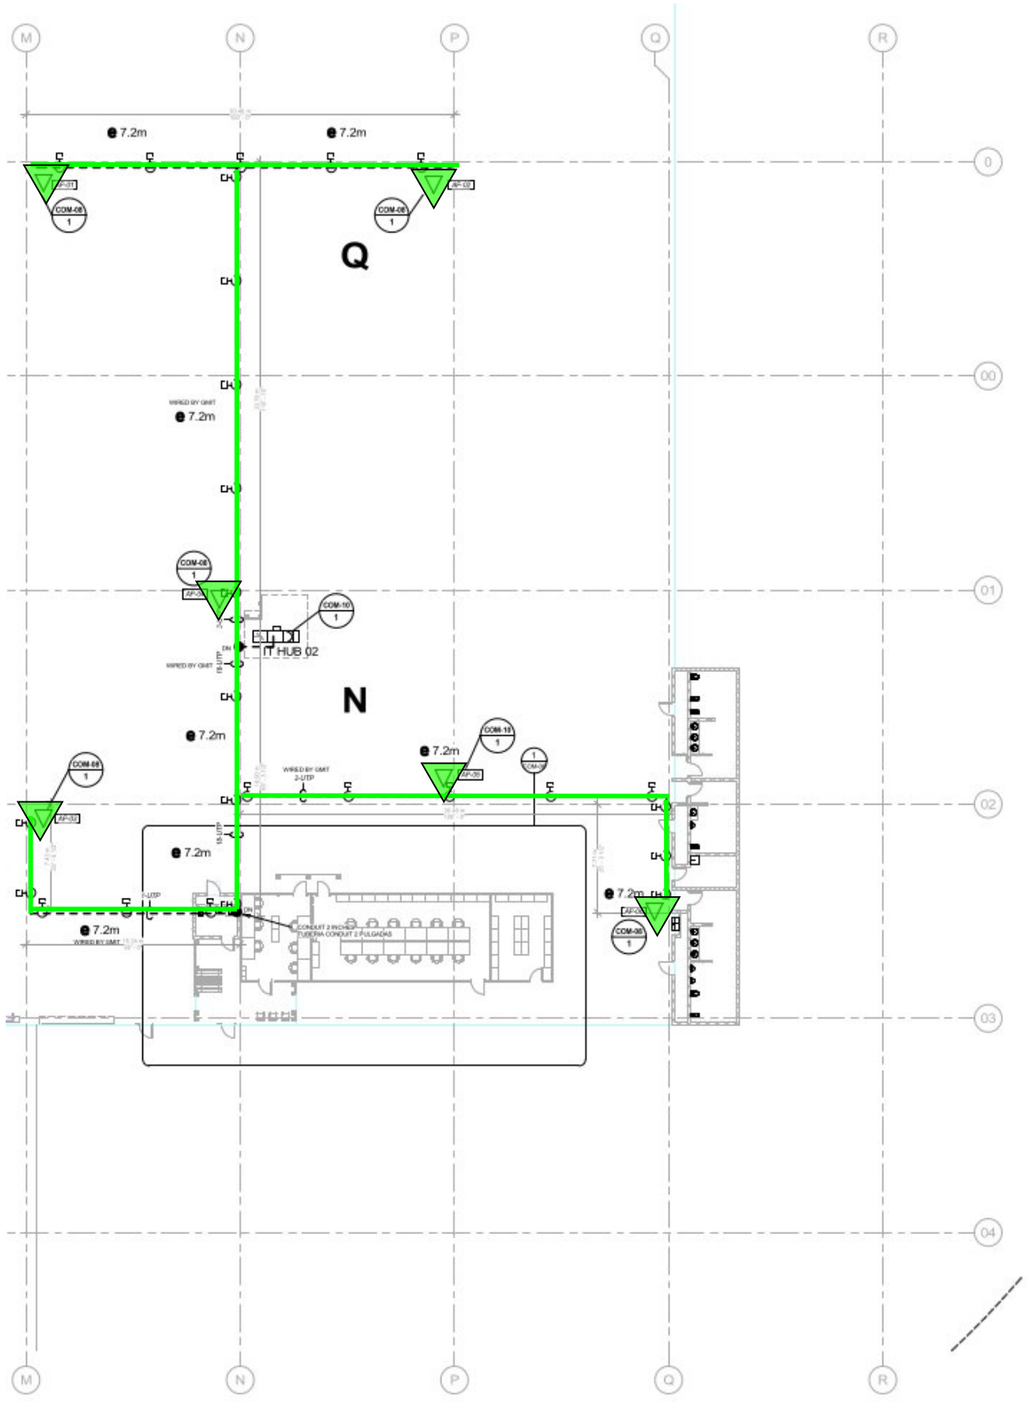

# SEQ	TASK	START	FINISH	RECOVERY		%	CONSTRAINS
				START	FINISH		
1	Instalación de soportes para cableado UTP	09/03/2026	17/03/2026			100%	COMPLETE
2	Instalación de soporte para Cajas FS e Instalación de cajas FS en Columna: M-0 / M-02 / N-01 / P-0 / P-02 / Q-02	02/05/2026	4/05/2026	10/06/2026	16/06/2026	100%	COMPLETE

PUNCH LIST		DATE		%
N.	DESCRIPCIÓN	START	FINISH	
1	Colocación de arillos faltantes en eje 0/N	20/07/2026	21/07/2026	100%

SIMBOLOGÍA

SOPORTERIA

NODOS (DISPOSITIVOS)

SYMBOLOGY FOR SCHEDULE

COMPLETE

IN PROGRESS


ON HOLD

CONSTRAIN

UPDATED:OCTUBRE | 13 | 2026

SUPERVISOR: LUIS APARICIO / HÉCTOR MUÑIZ

GRX
COMUNICACIONES EN ÁREA O,L. FASE 2 Y FASE 3

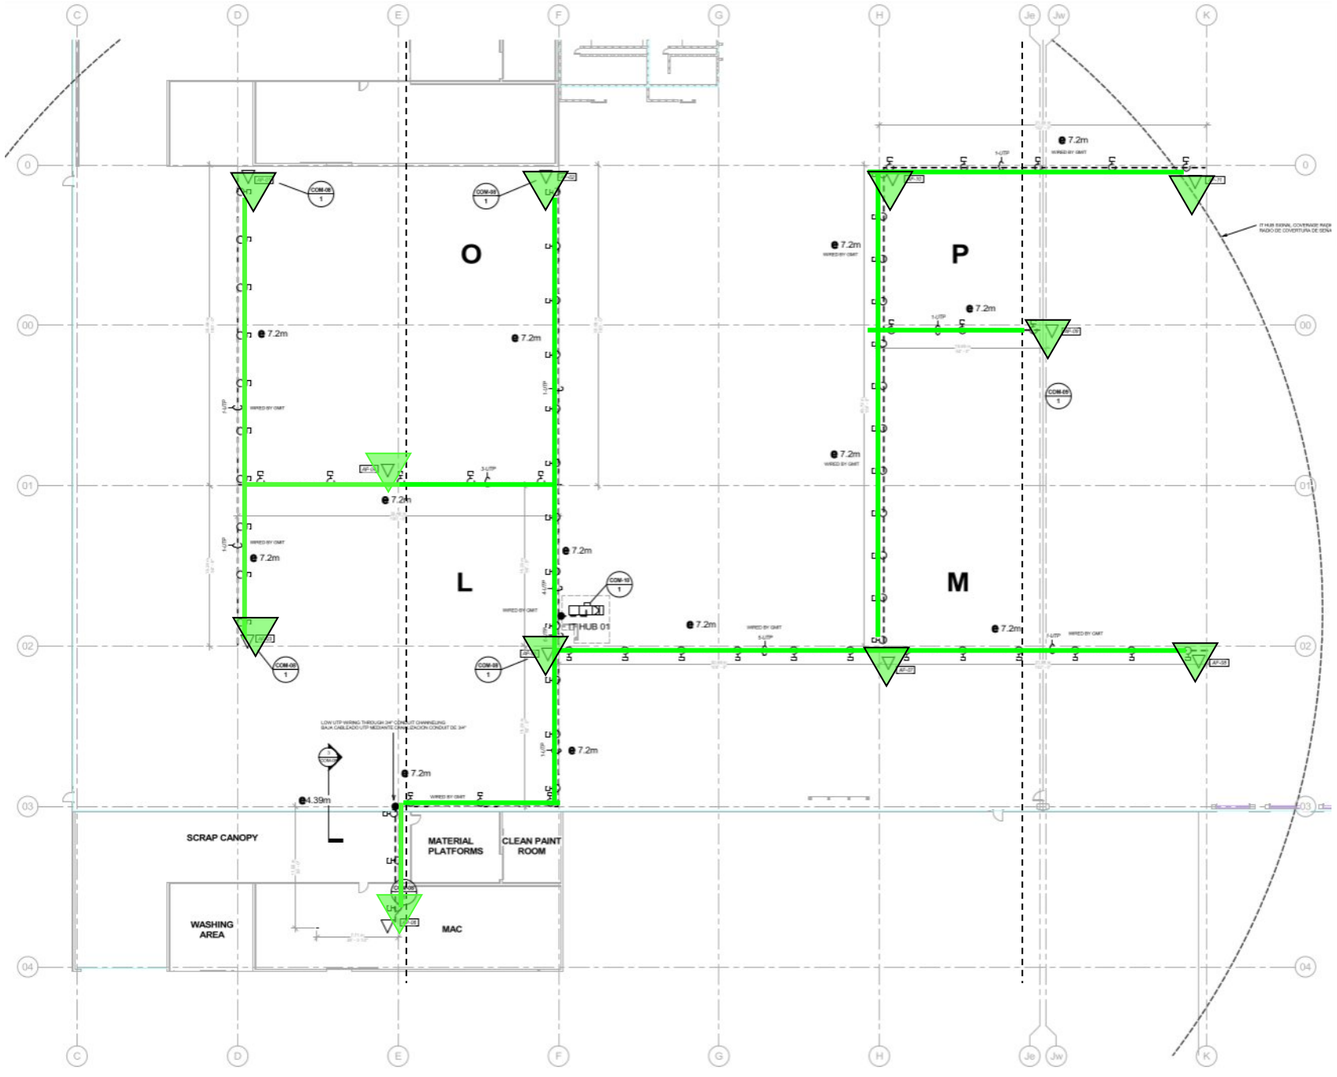

# SEQ	TASK	START	FINISH	RECOVERY		%	CONSTRAINS
				START	FINISH		
1	Instalación de soportes para cableado UTP	13/03/2026	27/03/2026	28/05/2026	31/05/2026	100%	COMPLETE
2	Instalación de soporte para Cajas FS e Instalación de cajas FS en Columna K-0 / H-0 / JW 00 / K 02)	29/04/2026	04/05/2026	10/06/2026	16/06/2026	100%	COMPLETE

COMUNICACIONES EN ÁREA O,L.FASE 3

# SEQ	TASK	START	FINISH	RECOVERY		%	CONSTRAINS
				START	FINISH		
1	Instalación de soportes para cableado UTP	01/06/2026	03/06/2026	01/06/2026	15/06/2026	100%	COMPLETE
2	Instalación de soporte para Cajas FS e Instalación de cajas FS en Columna D-01 / D-02 / E-01 / E-03, Fase3	16/06/2026	19/06/2026			100%	COMPLETE

PUNCH LIST		DATE		%
N.	DESCRIPCIÓN	START	FINISH	
1	Falta colocación de caja FS en eje E/01	20/07/2026	20/07/2026	100%

SIMBOLOGÍA

SOPORTERIA

NODOS (DISPOSITIVOS)

SYMBOLOGY FOR SCHEDULE

COMPLETE


IN PROGRESS

ON HOLD

CONSTRAIN

UPDATED: OCTUBRE | 13 | 2026
SUPERVISOR: LUIS APARICIO / HÉCTOR MUÑIZ

GRX
COMUNICACIONES EN OFICINAS, FASE 1

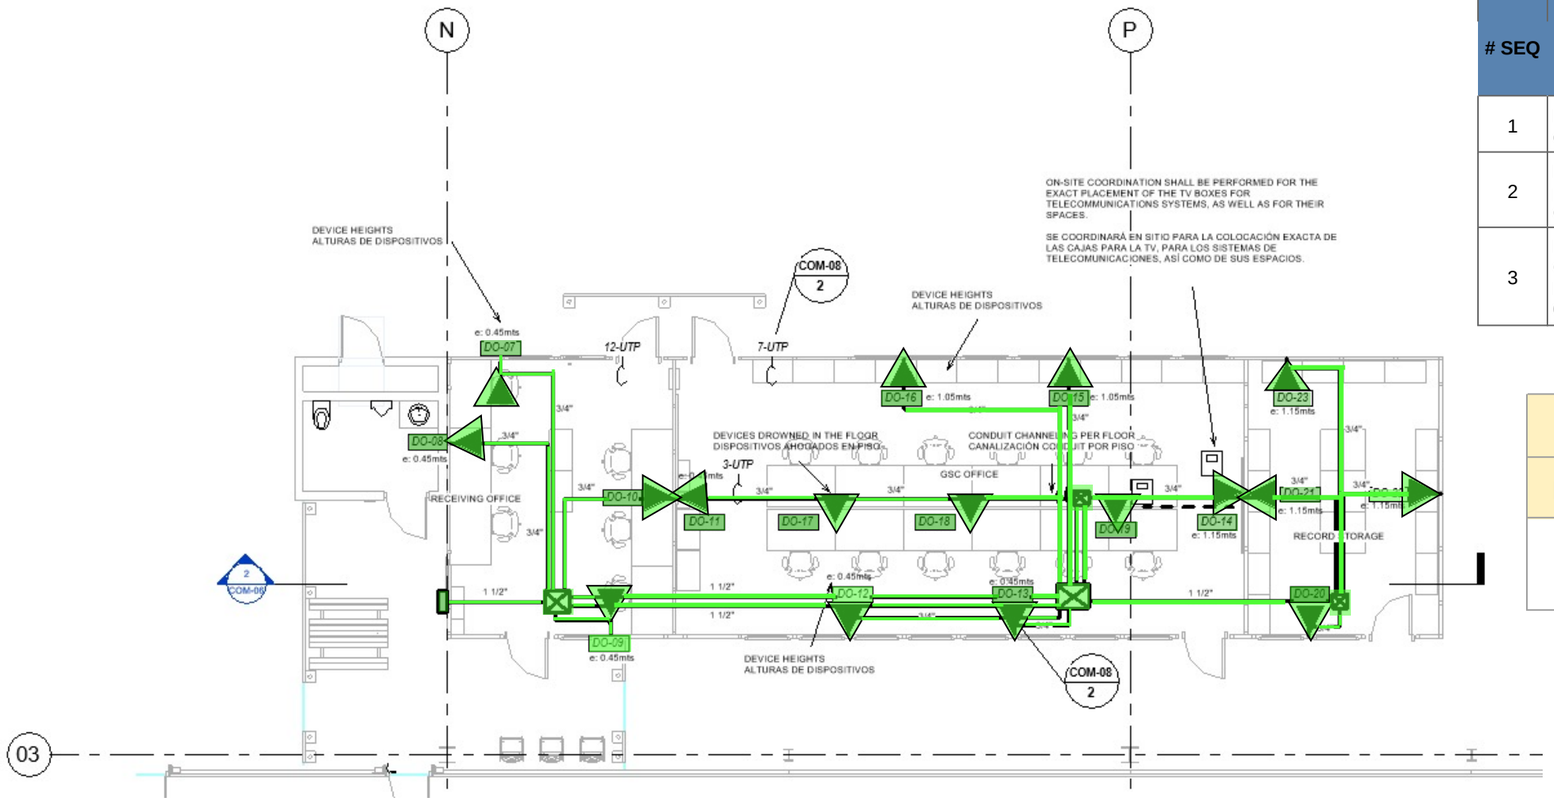

# SEQ	TASK	START	FINISH	RECOVERY START	RECOVERY FINISH	%	CONSTRAINS
1	Instalación de soportes para cableado UTP, Oficinas Fase1	01/06/2026	09/06/2026	07/07/2026	15/07/2026	100%	COMPLETE
2	Instalación de tubería conduit para bajadas a Nodos, en Oficinas, Fase1	15/06/2026	20/06/2026	07/07/2026	15/07/2026	100%	COMPLETE
3	Instalación de soporte para Cajas FS e Instalación de cajas FS en Columna: N-03 / P-03,Oficinas, Fase1	25/06/2026	27/06/2026	07/07/2026	15/07/2026	100%	COMPLETE

PUNCH LIST		DATE		%
N.	DESCRIPCIÓN	START	FINISH	
1	Colocación de soporteria en área de oficinas	20/07/2026	22/07/2026	100%

SIMBOLOGÍA

SOPORTERIA

NODOS (DISPOSITIVOS)

SYMBOLOGY FOR SCHEDULE

COMPLETE

IN PROGRESS


ON HOLD


CONSTRAIN

UPDATED: OCTUBRE | 13 | 2026

SUPERVISOR: LUIS APARICIO / HÉCTOR MUÑIZ

GRX
COMUNICACIONES EN ÁREA R,S,T

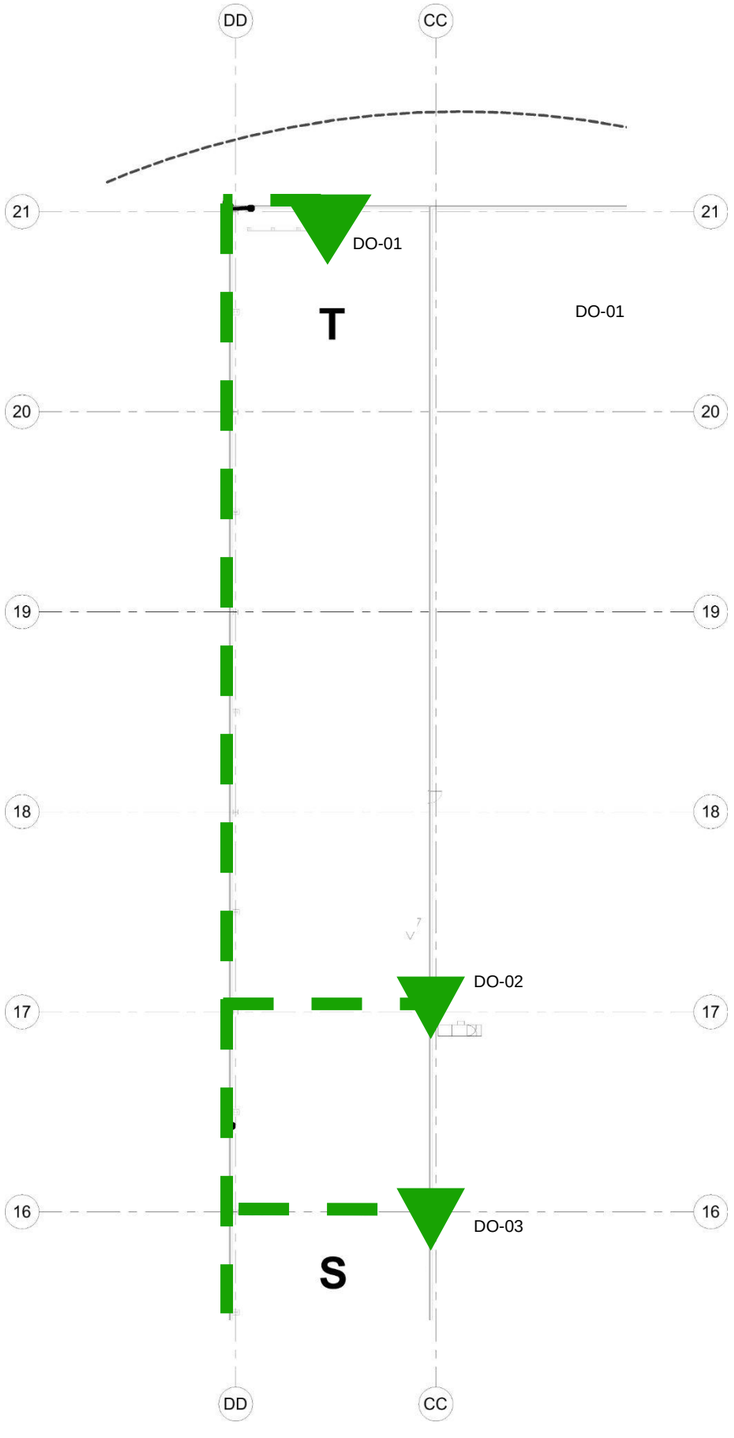

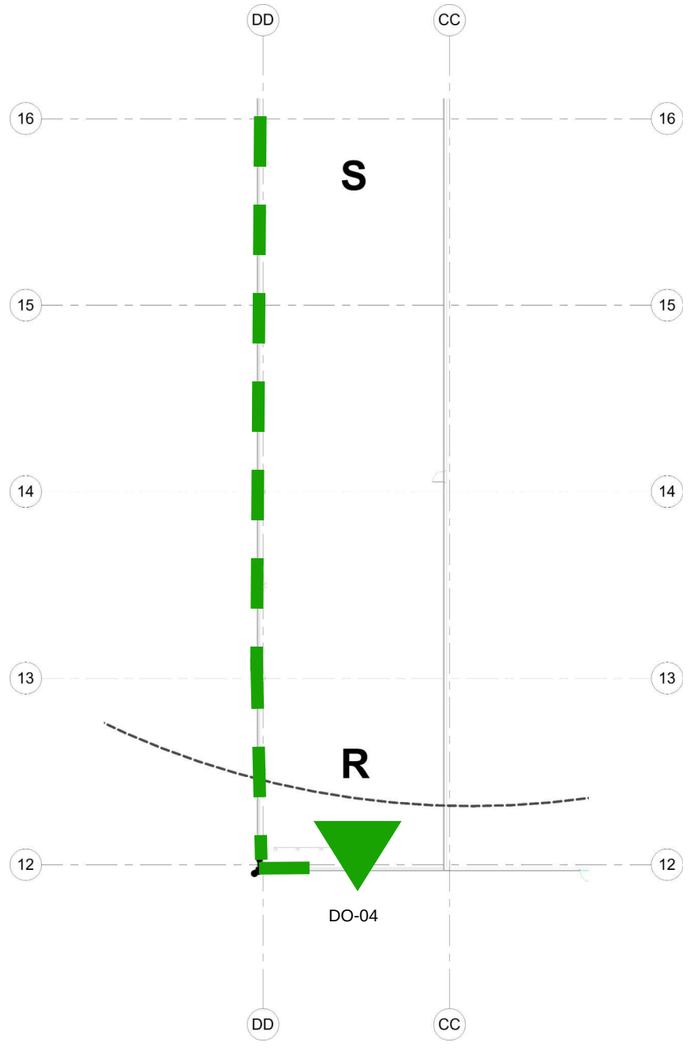

# SEQ	TASK	START	FINISH	RECOVERY START	RECOVERY FINISH	%	CONSTRAINS
1	Instalación de soportes para cableado UTP.	22/04/2026	24/04/2026	4/05/2026	8/05/2026	100%	COMPLETE
2	Instalación de soporte para Cajas FS e Instalación de cajas FS en Columna: DD-12 / DD-21 / CC-17 / CC-16	14/06/2026	14/06/2026			100%	COMPLETE

PUNCH LIST		DATE		%
N.	DESCRIPCIÓN	START	FINISH	
1	Colocación de arillos faltantes en eje 17/CC	18/07/2026	18/07/2026	100%

SIMBOLOGÍA


- SOPORTERIA
- NODOS (DISPOSITIVOS)

SYMBOLOGY FOR SCHEDULE

- COMPLETE
- IN PROGRESS
- ON HOLD
- CONSTRAIN

UPDATED: OCTUBRE | 13 | 2026
SUPERVISOR: LUIS APARICIO / HÉCTOR MUÑIZ

GRX
CONTROL DE ACCESO FASE 1

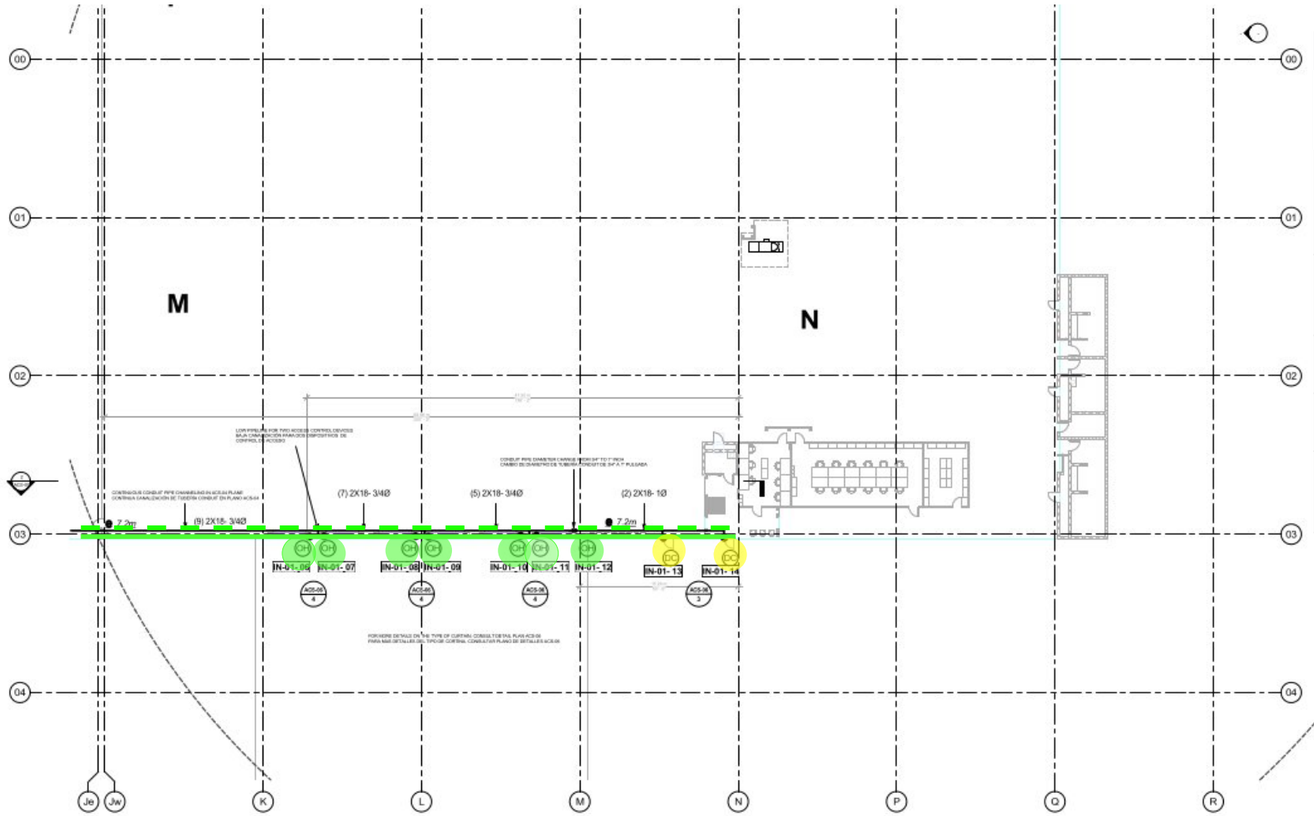

# SEQ	TASK	START	FINISH	RECOVERY		RECOVERY 02		%	CONSTRAINS
				START	FINISH	START	FINISH		
1	Instalación de soporteria para tuberia conduit, para dispositivos.	10/04/2026	17/04/2026	27/04/2026	01/05/2026			100%	COMPLETE
2	Instalacion de tuberia conduit para dispositivos	29/04/2025	30/04/2025	20/05/2025	10/06/2025			100%	COMPLETE
3	Instalación de Cable control 2x18	25/05/2026	26/05/2026	06/06/2026	09/06/2026			100%	COMPLETE
4	Prueba de cableado de continuidad	26/05/2026	26/05/2026	10/06/06	10/06/2026			100%	COMPLETE
5	Instalación de Dispositivos de control de Acceso, Fase1	26/05/2026	28/05/2026	11/06/2026	13/06/2026	21/09/2026	25/09/2026	85%	

PUNCH LIST		DATE		%
N.	DESCRIPCIÓN	START	FINISH	
1	Colocación de tapa Condulet LB	17/07/2026	17/07/2026	100%
2	Colocación de tapa FS	16/07/2026	16/07/2026	100%
3	Colocación de Etiqueta de FS	16/07/2026	16/07/2026	100%
4	Colocación de Etiqueta de Tubería ACS	21/07/2026	23/07/2026	100%
5	Colocación de Abrazadera de Overheads	20/07/2026	23/07/2026	100%
6	Colocación de Remate de Unicanal 4x4 en soportería en en columna.(matafilos)	21/07/2026	22/07/2026	100%
7	Falta colocar etiqueta (IN-01-14)	28/07/2026	01/08/2026	100%
8	Colocar soporte a condulet que sale de la caja raco (IN-01-06), (IN-01-13) y (IN-01-14)	28/07/2026	01/08/2026	100%
9	Colocar soporte en tubería y dispositivo (IN-01-12)	28/07/2026	01/08/2026	100%
10	Instalar dispositivo (IN-01-08)	28/07/2026	01/08/2026	100%

INSTALACION DE DISPOSITIVOS				
DEVICE	INSTALLATION DATE	DEVICE	INSTALLATION DATE	INSTALLATION DATE (RECOVERY)
OH (IN-01-06)	19/06/2026	OH (IN-01-11)	20/06/2026	
OH (IN-01-07)	19/06/2026	OH (IN-01-12)	21/06/2026	
OH (IN-01-08)	19/06/2026	DC (IN-01-13)	21/09/2026	21/10/2026 / 23/10/2026
OH (IN-01-09)	20/06/2026	DC (IN-01-14)	25/09/2026	21/10/2026 / 23/10/2026
OH (IN-01-10)	20/06/2026			

SYMBOLOGY FOR SCHE

- COMPLETE
- IN PROGRESS
- ON HOLD
- CONSTRAIN


SIMBOLOGÍA

- SOPORTERIA
- TUBERÍA
- DISPOSITIVO

UPDATED: OCTUBRE | 13 | 2026
SUPERVISOR: LUIS APARICIO / HÉCTOR MUÑIZ

GRX
CONTROL DE ACCESO FASE 2

PUNCH LIST		DATE		
N.	DESCRIPCIÓN	START	FINISH	%
1	Colocación de tapa Condulet LB	17/07/2026	17/07/2026	100%
2	Colocación de tapa FS	16/07/2026	16/07/2026	100%
3	Colocación de Etiqueta de FS	16/07/2026	16/07/2026	100%
4	Colocación de Etiqueta de Tubería ACS	21/07/2026	23/07/2026	100%
5	Colocación de Abrazadera de Overheads	20/07/2026	20/07/2026	2
6	Colocación de Remate de Unicanal 4x4 en soportería en columna.	21/07/2026	22/07/2026	100%
7	Alinear tuberia, colocar tapa, colocar soporte de caja racko (IN-01-05)	28/07/2026	01/08/2026	100%
8	Colocar etiquetas de identificación (E/02)	28/07/2026	01/08/2026	100%

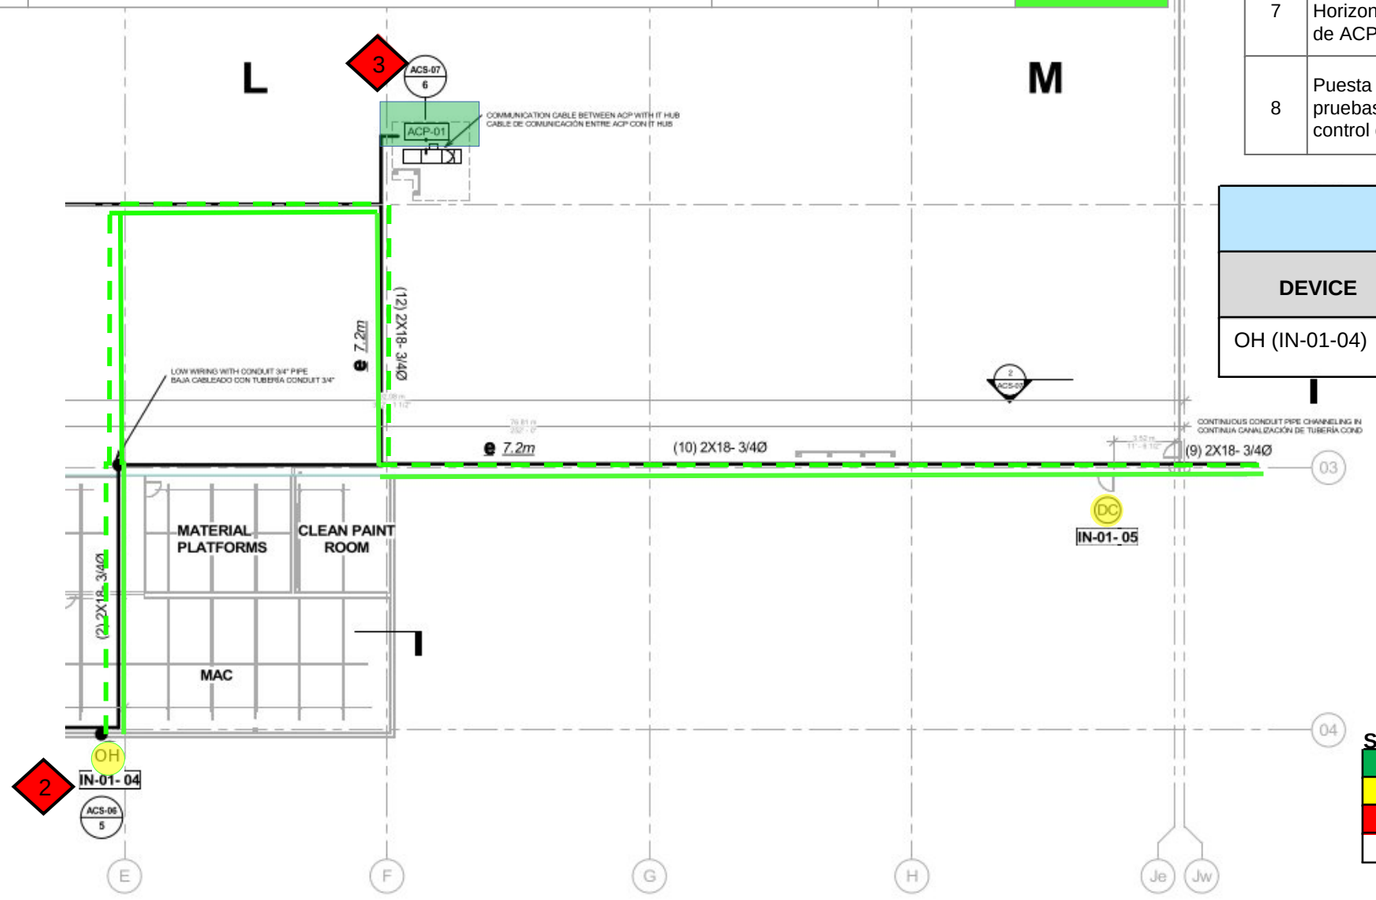

# SEQ	TASK	START	FINISH	RECOVERY START	RECOVERY FINISH	RECOVERY 02 START	RECOVERY 02 FINISH	%	CONSTRAINS
1	Instalacion de soporteria para tuberia conduit	28/04/2026	29/04/2026					100%	COMPLETE
2	Instalacion de tuberia conduit	30/05/2026	30/05/2026	05/06/2026	09/06/2026			100%	COMPLETE
3	Instalación de Cable control 2x18	1/06/2026	02/06/2026	09/06/2026	19/06/2026			100%	COMPLETE
4	Instalación de Panel de Control de Acceso	15/06/2026	16/06/2026	19/06/2026	21/06/2026			100%	COMPLETE
5	Prueba de cableado de continuidad	02/06/2026	02/06/2026	11/06/2026	11/06/2026			100%	COMPLETE
6	Instalación de Dispositivos de control de Acceso	03/06/2026	04/06/2026	15/06/2026	26/06/2026	21/09/2026	2509/2026	0%	2
7	Instalación de Cableado Horizontal, comunicación de ACP al HIT HUB	2/06/2026	3/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	TBD	TBD	0%	3
8	Puesta en operación y pruebas del sistema de control de acceso	22/06/2026	26/06/2026			14/07/2026	18/07/2026	0%	3

INSTALACION DE DISPOSITIVOS					
DEVICE	INSTALLATION DATE	INSTALLATION DATE (RECOVERY)	DEVICE	INSTALLATION DATE	INSTALLATION DATE (RECOVERY)
OH (IN-01-04) 2	21/09/2026	21/10/2026 / 23/10/2026	DC (IN-01-05)	25/09/2026	21/01/2026 / 23/10/2026

2 Falta la colocación de las puerta coirrediza por otros

3 Falta de instalacion de it hub

SYMBOLOGY FOR SCHEDULE

- COMPLETE
- IN PROGRESS
- ON HOLD
- CONSTRAIN


SIMBOLOGÍA

- SOPORTERIA
- CABLEADO
- DISPOSITIVO

UPDATED: OCTUBRE | 13 | 2026
SUPERVISOR: LUIS APARICIO / HÉCTOR MUÑIZ

C

GRX
CONTROL DE ACCESO FASE 3

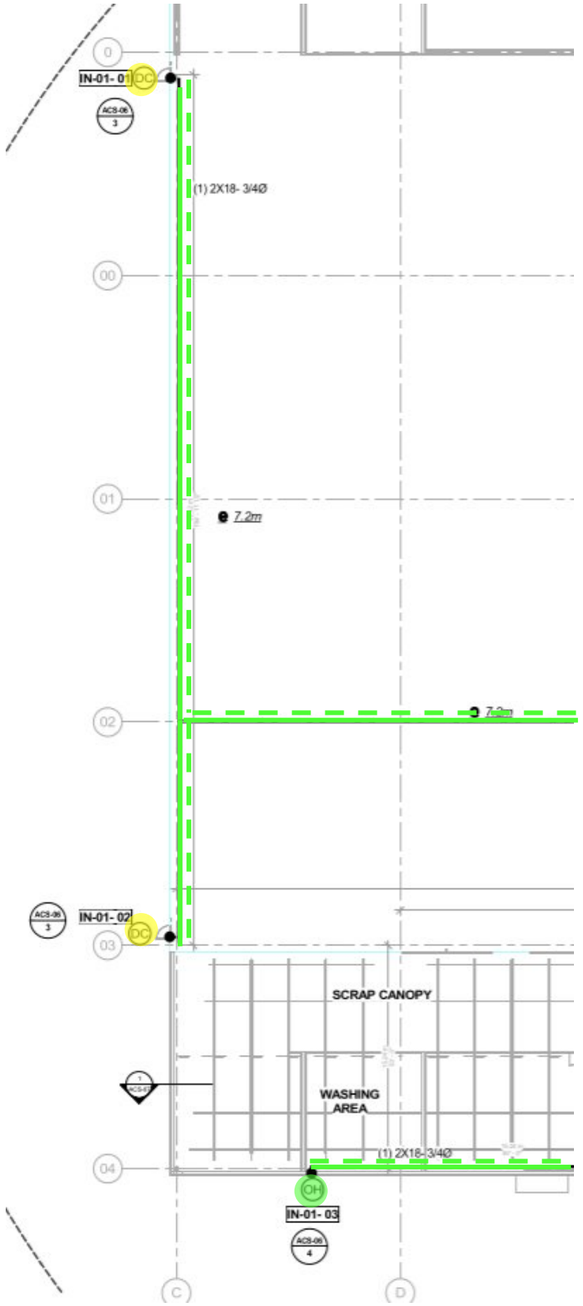

# SEQ	TASK	START	FINISH	RECOVERY		%	CONSTRAINS
				START	FINISH		
1	Instalacion de soporteria para tuberia conduit	1/06/2026	6/06/2026	09/06/2026	11/06/2026	100%	COMPLETE
2	Instalacion de tuberia conduit	08/06/2026	12/06/2026	15/06/2026	19/06/2026	100%	COMPLETE
3	Instalación de Cable control 2x18	15/06/2026	16/06/2026	20/06/2026	20/06/2026	100%	COMPLETE
4	Prueba de cableado de continuidad	17/06/2026	18/06/2026	21/06/2026	21/06/2026	100%	COMPLETE
5	Instalación de Dispositivos de control de Acceso	18/06/2026	19/06/2026	23/06/2026	23/06/2026	33%	

INSTALACION DE DISPOSITIVOS				
DEVICE	INSTALLATION DATE	INSTALLATION DATE (RECOVERY)	DEVICE	INSTALLATION DATE
DC (IN-01-01)	21/09/2026	21/10/2026 / 23/10/2026	OH (IN-01-03)	6/08/2026
DC (IN-01-02)	25/09/2026	21/10/2026 / 23/10/2026		

Falta suministr y colocación de puertas (por otros)

SYMBOLOGY FOR SCHEDULE

- COMPLETE
- IN PROGRESS
- ON HOLD
- CONSTRAIN


SIMBOLOGÍA

- SOPORTERIA
- CABLEADO
- DISPOSITIVO

PUNCH LIST		DATE		%
N.	DESCRIPCIÓN	START	FINISH	
1	Colocación de tapa FS	16/07/2026	16/07/2026	100%
2	Colocación de Etiqueta de FS	16/07/2026	16/07/2026	100%
3	Colocación de Etiqueta de Tubería ACS	21/07/2026	23/07/2026	100%
4	Colocación de Remate de Unicanal 4x4 en soportería en en columna.	23/07/2026	23/07/2026	100%
5	Falta colocar tapa y soporte a condulet que sale de la caja raco (IN-01-02) y (IN-01-01)	28/07/2026	01/08/2026	100%

UPDATED: OCTUBRE | 13 | 2026
SUPERVISOR: LUIS APARICIO / HÉCTOR MUÑIZ

GRX
VIDEO VIGILANCIA 60 Y 9 BAHIAS

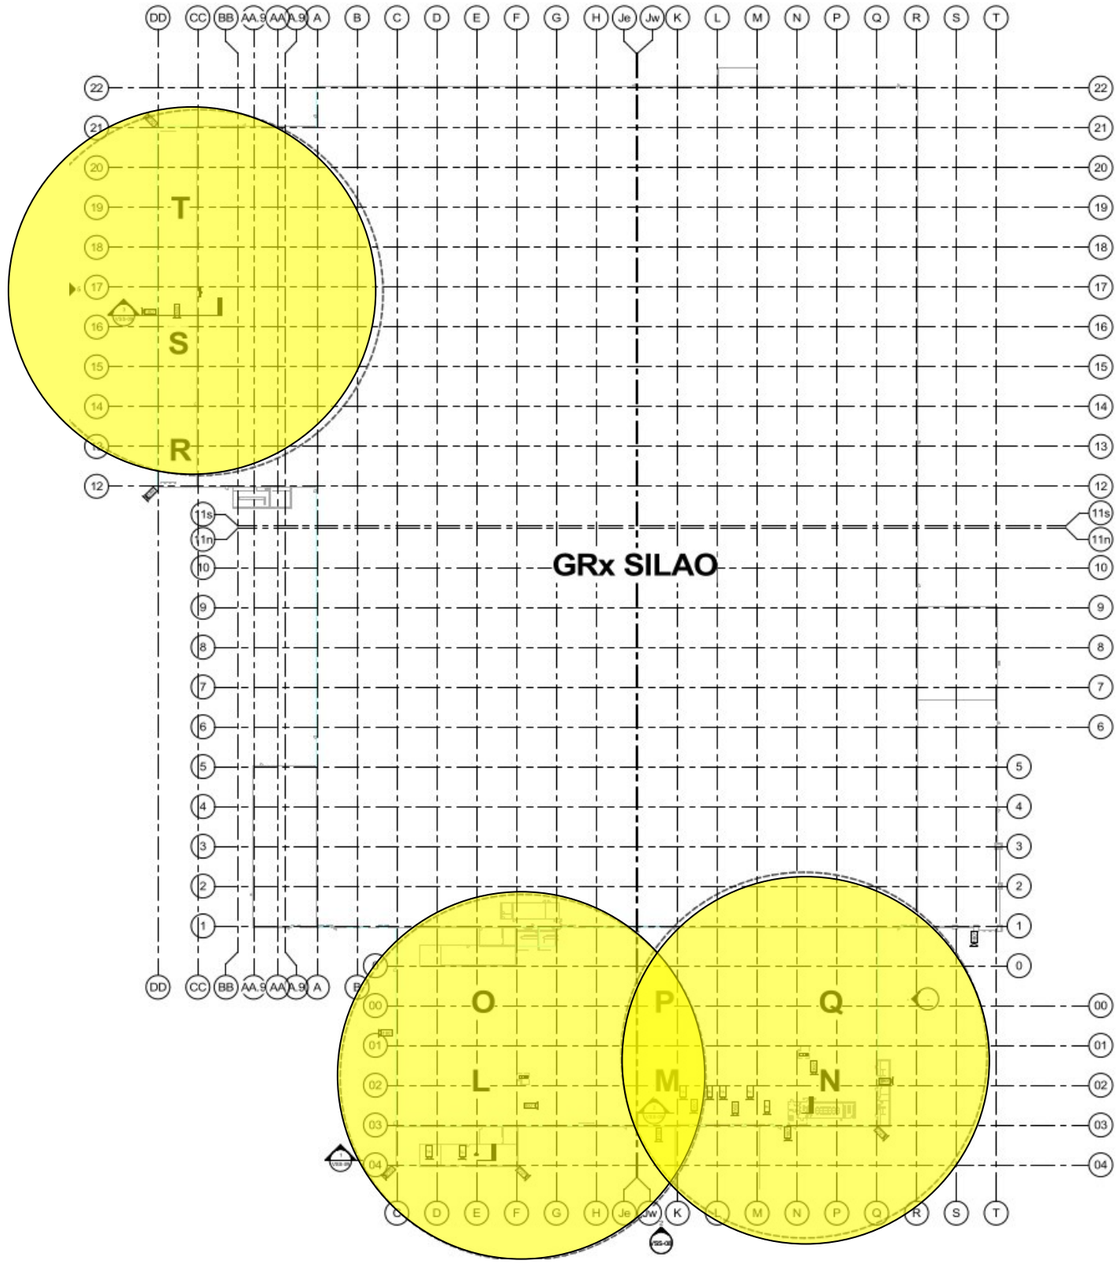

# SEQ	TASK	START	FINISH	RECOVERY START	RECOVERY FINISH	%	CONSTRAINS
1	Prueba de cableado UTP cat 6A, etiquetado y certificación (60 y 9 bahias)	22/06/2026	26/06/2026			100%	
2	Instalación de servidor y configuración en 60 y 9 bahias	26/06/2026	30/06/2026	20/09/2026	22/09/2026	0%	1 3
3	Alta de licencia y enfoque de cámaras en 60 y 9 bahias	28/06/2026	29/06/2026	23/09/2026	23/09/2026	0%	2
4	Remates de nodos en el panel de parcheo en cada it-hub en 60 y 9 bahias	25/06/2026	26/06/2026	TBD	TBD	0%	4

1 Se necesita la instalación del IT-HUB por GM-IT para finalizar actividades.

2 Se necesita las direcciones IP y la asignación de puertos en los IT-HUB por GM-IT

3 Se necesita por parte de GM-IT, definir la ubicación en el rack y la dirección IP para el NVR.

4 Remate de panel de parcheo por otro contratista

SIMBOLOGÍA

SOPORTERIA

CABLEADO

DISPOSITIVO

SYMBOLOGY FOR SCHEDULE

COMPLETE
IN PROGRESS
ON HOLD
CONSTRAIN

UPDATED: OCTUBRE | 13 | 2026
SUPERVISOR: LUIS APARICIO / HÉCTOR MUÑIZ
